


Nr.	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende
1	Projektdauer	172,4 Wochen	Mon 29.04.19	Fre 14.10.22
2	Planungsphase (NF 4.200m ² /BGF 4.700m ²)	172,4 Wochen	Mon 29.04.19	Fre 14.10.22
3	Stufe 1	35,5 Wochen	Mon 29.04.19	Mit 22.01.20
4	LPH 1 - Grundlagenermittlung	6 Wochen	Mon 29.04.19	Fre 07.06.19
5	LPH 2 - Vorplanung	16 Wochen	Mon 10.06.19	Fre 27.09.19
6	vertiefte Kostenschätzung nach Gewerken	0 Wochen	Fre 27.09.19	Fre 27.09.19
7	LPH 3 - Entwurfsplanung	7 Wochen	Mon 30.09.19	Fre 15.11.19
8	vertiefte Kostenberechnung mit Positionen	0 Wochen	Fre 15.11.19	Fre 15.11.19
9	Wiederholte Abgabe Entwurf	6,5 Wochen	Mon 18.11.19	Mit 22.01.20
10	Plausibilitätsprüfung	8 Wochen	Mit 26.02.20	Don 23.04.20
11	Stellungnahme Revisionsamt	0 Wochen	Mit 13.05.20	Mit 13.05.20
12	Einarbeitung Prüfungsergebnis in Entwurf	5 Wochen	Don 14.05.20	Mit 17.06.20
13	Vorbereitung Stadtverordnetenversammlung	1 Woche	Don 18.06.20	Mit 24.06.20
14	Realisierungsbeschluss	0 Wochen	Don 02.07.20	Don 02.07.20
15	Stufe 2	6 Wochen	Don 18.06.20	Mit 29.07.20
16	LPH 4 - Genehmigungsplanung	6 Wochen	Don 18.06.20	Mit 29.07.20
17	Genehmigungsphase	28 Wochen	Don 30.07.20	Mit 03.03.21
18	Stufe 3	34 Wochen	Don 30.07.20	Mit 14.04.21
19	LPH 5 - Ausführungsplanung	20 Wochen	Don 30.07.20	Mit 16.12.20
20	LPH 6 - Vorbereitung der Vergabe	16 Wochen	Don 24.09.20	Mit 03.02.21
21	LPH 7 - Mitwirkung bei der Vergabe	16 Wochen	Don 03.12.20	Mit 14.04.21
22	Stufe 4	79 Wochen	Mon 29.03.21	Fre 14.10.22
23	LPH 8 - Objektüberwachung	79 Wochen	Mon 29.03.21	Fre 14.10.22
24	Stufe 5	0 Wochen	Fre 14.10.22	Fre 14.10.22
25	LPH 9 - Objektbetreuung	0 Wochen	Fre 14.10.22	Fre 14.10.22
27	Bauphase	80 Wochen	Mon 29.03.21	Fre 21.10.22
28	Erdbau	7 Wochen	Mon 29.03.21	Fre 14.05.21
29	Rohbau	24 Wochen	Mon 17.05.21	Fre 29.10.21
30	Hülle	40 Wochen	Mon 04.10.21	Fre 22.07.22
31	Ausbau und TGA	44 Wochen	Mon 29.11.21	Fre 14.10.22
32	Außenanlagen	12 Wochen	Mon 25.07.22	Fre 14.10.22
33	Inbetriebnahme	4 Wochen	Mon 26.09.22	Fre 21.10.22
35	Übergabe Bauherr	0 Tage	Fre 21.10.22	Fre 21.10.22

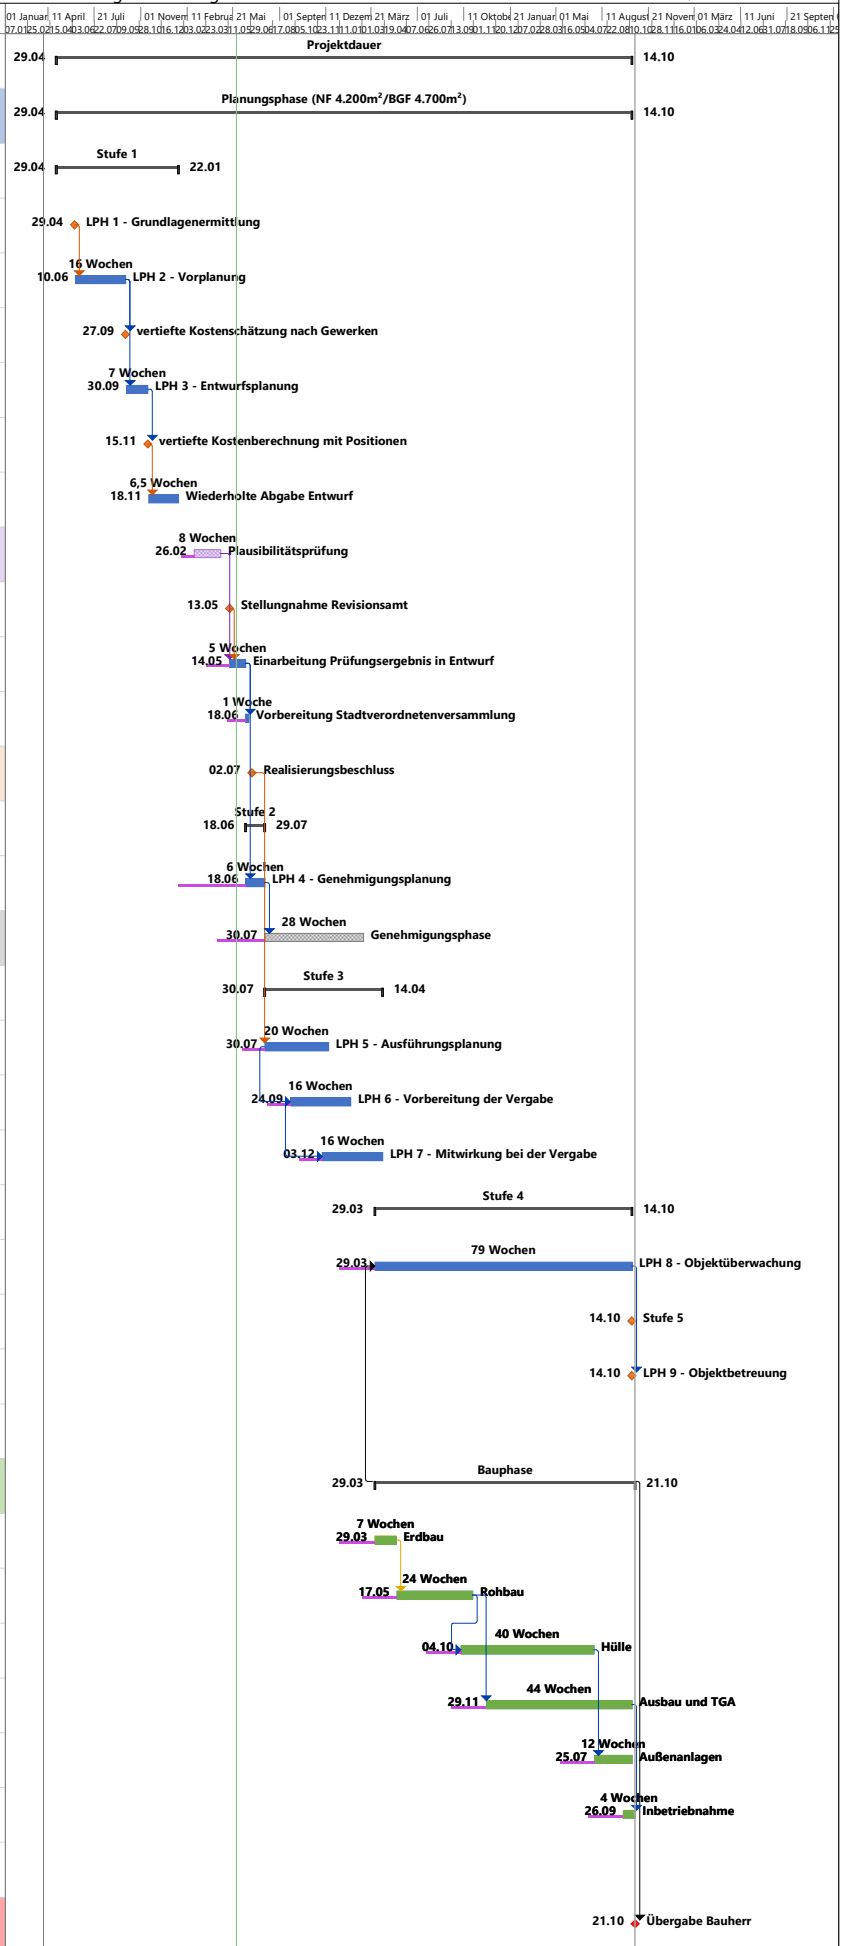

Projekt: PdP Leichtathletik WI 2
 Datum: 28.05.2020 Rie
 Vorgang 2
 Unterbrechung
 Meilenstein
 Sammelvorgang
 Projektsammelvorgang
 Meilenstein manuell
 Vorgang manuell
 Verzögerung
