


I.01941 - 66 WIN Naurod Obergasse

Das Projekt befindet sich in der Nutzung:

Ausführung:
17-V-66-0205

Neugestaltung der Obergasse zwischen dem Kreuzungsbereich Obergasse/Kirchhhohl/Fondetter Straße bis Haus Nr. 10, Ausbau zu einer niveaugleichen Platzfläche; Inbetriebnahme war am 14.10.2019; Deckung der Mehrkosten erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses; Schlussrechnung steht noch aus

Rückmeldung des Fachbereichs vom 14.01.2020

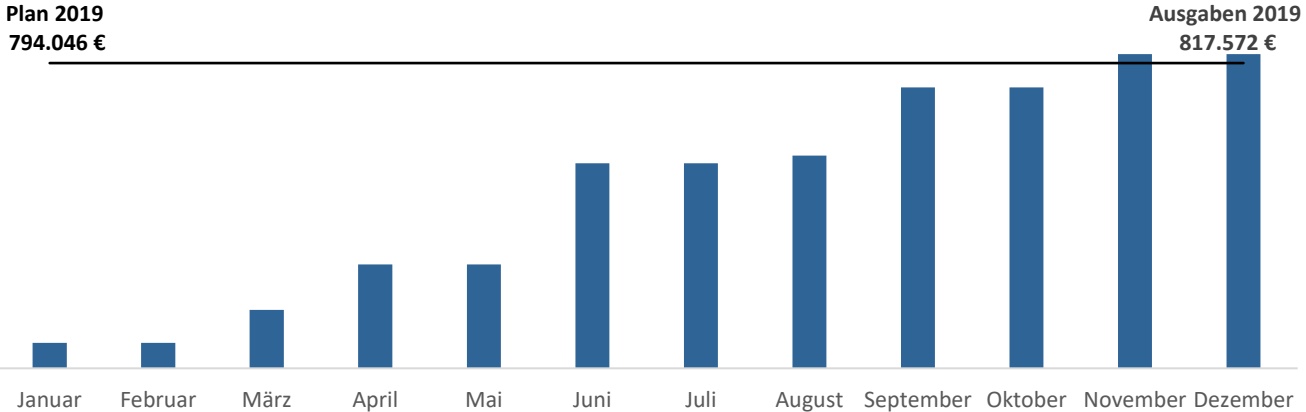

I.02256 - 10 BGH Delkenheim Generalsanierung


3. Bauabschnitt

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Der 3. Bauabschnitt ist angelaufen. Die Fertigstellung ist für Mai 2020 geplant.

Grundsatz:
14-V-10-0030
Ausführung:
17-V-10-0011
weitere Vorlagen:
18-V-10-0008


Rückmeldung des Fachbereichs vom 14.01.2020



veranschlagte Ausgaben
4.723.000 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
4.723.000 €
gesamte Ausgaben:
1.798.437 €

Plan 2019
3.556.023 €

Ausgaben 2019
632.288 €



I.03264 - 67 Neukonzeption Kulturpark

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Eine Sitzungsvorlage zur Freigabe des Budgets und zur Umsetzung von ÜPL-Budgets aus Resten anderer Teilmaßnahmen sowie von Fördermitteln ist 2018 beschlossen worden. Die Baumaßnahme befindet sich ab Jan. 2020 in der Umsetzung. Weitere Teilmaßnahmen werden folgen. Eine SV ist bereits in der Vorbereitung.

Grundsatz:
07-V-61-0019
Ausführung:
14-V-67-0002
weitere Vorlagen:
18-V-67-0009 19-V-67-0010

Rückmeldung des Fachbereichs vom 17.01.2020



veranschlagte Ausgaben
4.289.080 €
Einnahmen
368.991 €
Zuschussbedarf
3.920.089 €
gesamte Ausgaben:
2.156.596 €

Plan 2019
2.203.582 €

Ausgaben 2019
71.098 €

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

I.03302 - 37 Neubau Feuer- u Rettungswache Igstadt

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Die Baumaßnahme liegt im Zeitplan. Fertigstellung voraussichtlich Mitte 2021.

Grundsatz:
17-V-37-0003
Ausführung:
18-V-37-0003
weitere Vorlagen:
15-V-37-0003
16-V-37-0004


Rückmeldung des Fachbereichs vom 14.01.2020



	veranschlagte Ausgaben	24.100.000 €
	Zuschussbedarf	24.100.000 €
Einnahmen	0 €	
	gesamte Ausgaben:	5.906.942 €

Plan 2019
7.236.902 €

Ausgaben 2019
5.153.907 €

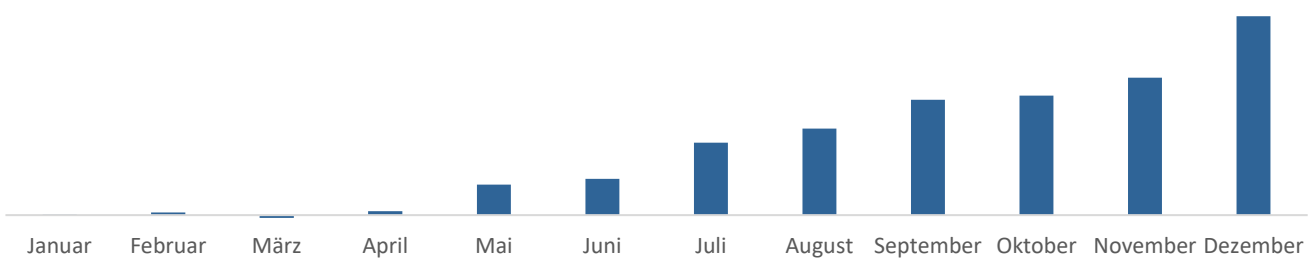

I.03328 - 52 SH Taunushalle Generalsanierung

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Grundsatz:
16-V-52-0018

Das beauftragte Architekturbüro hat im Rahmen der LPH 1-2 Vorschläge zur flächenmäßigen Optimierung vorgelegt, die jetzt vertiefend untersucht werden. Dabei haben sich grundlegende Fragen (u. a. zum Bestandsschutz, Stellplätzen, Schallemissionen) ergeben, die eine Bauvoranfrage erforderlich machen, um Planungssicherheit zu erhalten. Vor der Bauvoranfrage muss noch eine Lösung für die Überschreitung der Lärmimmissionswerte erarbeitet werden.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 14.01.2020



	veranschlagte Ausgaben	8.500.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	8.500.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	476.247 €

Plan 2019
1.334.554 €

Ausgaben 2019
90.801 €



I.03440 - 40 Th.-Fliedner-Schule Ausbau Vollgymn.

Das Projekt befindet sich in der Nutzung:

Der Neubau ist mit dem neuen Schuljahr in Betrieb gegangen.

Für diese Maßnahme wurden Gesamtkosten i.H.v. 19.077.500 € beschlossen.

weitere Vorlagen:


12-V-40-0042

15-V-40-0002

Rückmeldung des Fachbereichs vom 16.01.2020



veranschlagte Ausgaben	17.812.000 €
Einnahmen	0 €
Zuschussbedarf	17.812.000 €
gesamte Ausgaben:	17.752.233 €

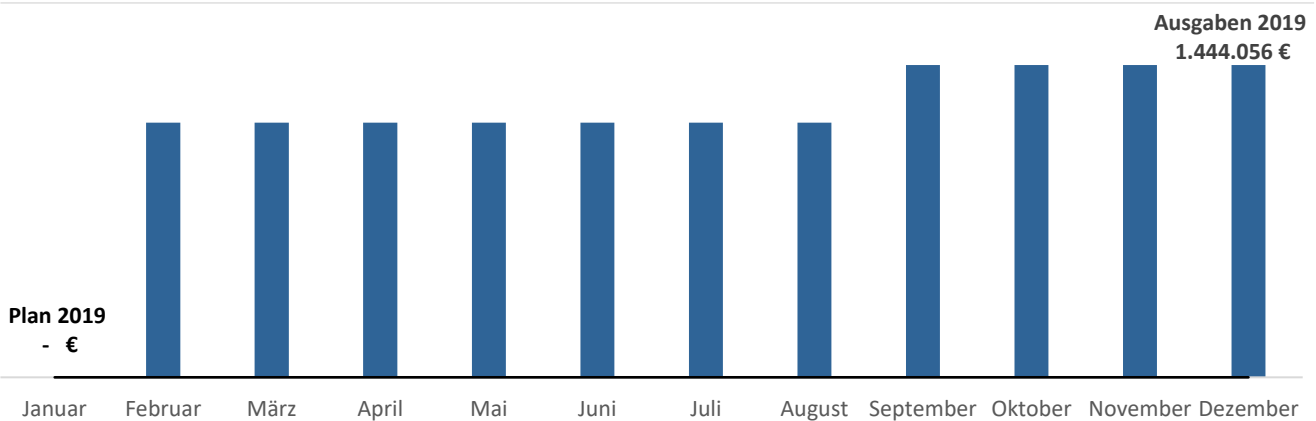

I.03540 - 36 LSW Schiersteiner Brücke BAB 643

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

weitere Vorlagen:
12-V-36-0030

Hessen Mobil wurde von der LHW beauftragt, im Rahmen des Neubaus der Schiersteiner Brücke BAB 643 Lärmschutzwände zu errichten. Bestimmte Vorarbeiten wurden erledigt, für die Teilrechnungen von Hessen Mobil erwartet werden; Rechnungshöhe und Rechnungseingang sind weiterhin unklar.(Vertragliche Verpflichtung-Klärungsbedarf-Verzögerungen).

Rückmeldung des Fachbereichs vom 16.01.2020



	veranschlagte Ausgaben	1.094.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	1.094.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	0 €

Plan 2019
1.094.000 €

Ausgaben 2019
- €

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

I.03722 - 40 Albert-Schweitzer-Schule Neubau

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Spatenstich August 2018. Baumaßnahme läuft. Richtfest 2019. 40 zahlt, 64 plant und organisiert.

Baubeginn 2018. Wir rechnen damit, dass die Planerkosten und Baukosten konkret ab 2019 fällig werden. Es zeichnet sich eine Kostenüberschreitung in Höhe von 2.000.000 Euro ab.

Grundsatz:
13-V-40-0022
Ausführung:
16-V-40-0020
weitere Vorlagen:
15-V-40-0033
15-V-40-0022


Rückmeldung des Fachbereichs vom 16.01.2020



	veranschlagte Ausgaben	15.804.000 €
	Zuschussbedarf	15.804.000 €
Einnahmen	0 €	
	gesamte Ausgaben:	6.964.410 €

Plan 2019
5.000.000 €

Ausgaben 2019
4.854.517 €

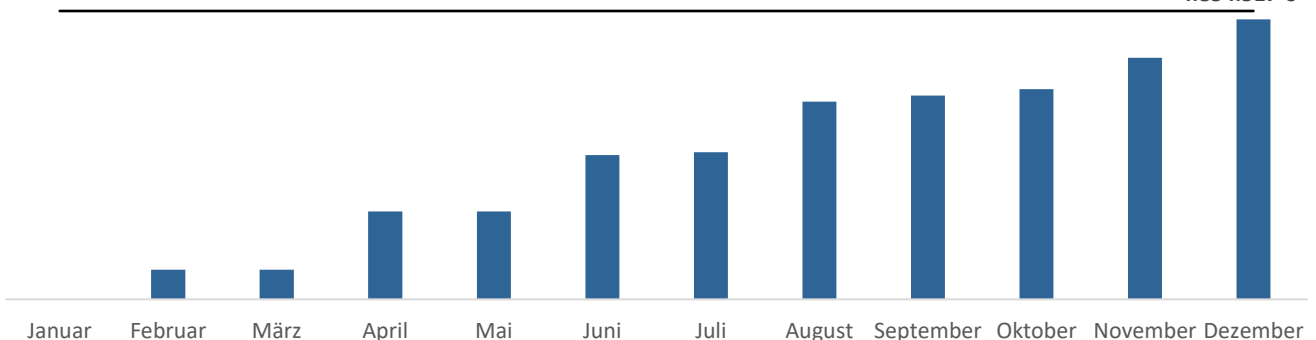

I.03746 - 51 AWA Sophienstraße - Aufzug

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Grundsatz:
17-V-51-0025

Geplante Gesamtkosten der Maßnahme 300.000 €, Budgetzusetzung in 2018 von 291.000 €. Mehrkosten, da die Wohnanlage komplett barrierefrei erschlossen wird.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 13.01.2020



Plan 2019
568.371 €

Ausgaben 2019
42.275 €




I.03756 - 40 Rudolf-Dietz-Schule

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Laut StVV Beschluss sind 12,385 Mio Euro genehmigt. Finanzierung der Raten aus I.04471 - 40 invest Budgettopf im Rahmen der Kassenwirksamkeit. Erwartete Mehrkosten 600.000 Euro über Genehmigung durch Baukostensteigerung.

Grundsatz:
13-V-40-0003
Ausführung:
16-V-40-0015

Rückmeldung des Fachbereichs vom 16.01.2020

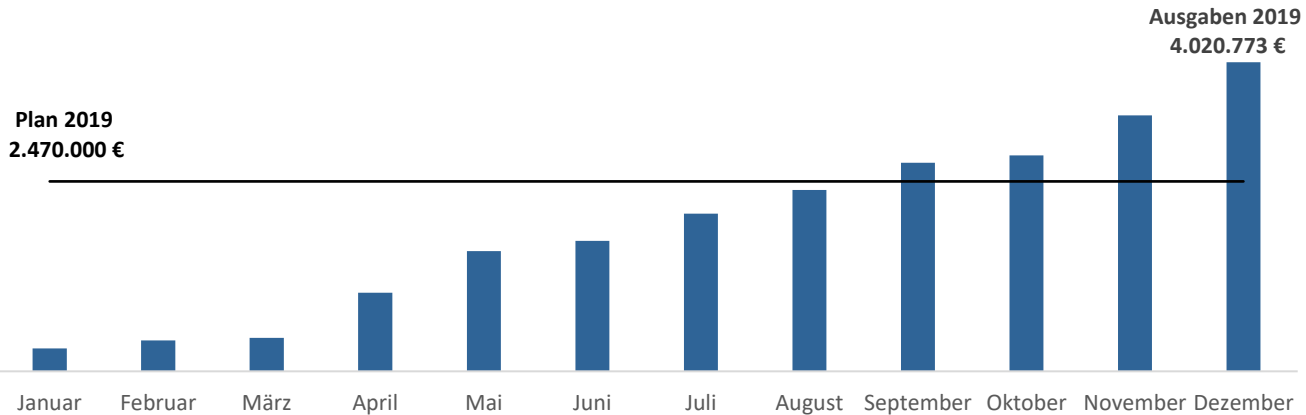

I.03757 - 41 Kunsthaus Generalsanierung

1. Bauabschnitt

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Sitzungsvorlage zu aktualisierter Kostenberechnung und externer Plausibilisierung wurde am 03.05.18 von STVV beschlossen.

Grundsatz:
15-V-41-0014
Ausführung:
15-V-41-0014
weitere Vorlagen:
18-V-41-0003


Rückmeldung des Fachbereichs vom 08.01.2020



veranschlagte Ausgaben
6.300.000 €
Einnahmen
0 €
Zuschussbedarf
6.300.000 €
gesamte Ausgaben:
2.309.436 €

Plan 2019
3.042.553 €

Ausgaben 2019
1.135.418 €



I.03762 - 40 Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:


Spatenstich 05.12.2018, Verzögerung in der Umsetzung durch überhöhte Ausschreibungsergebnisse. Neuer Fertigstellungstermin März 21. Kostenüberschreitung ca. 300.000 €, Gesamtkosten neu 17,133 Mio €

Grundsatz:
14-V-05-0005
Ausführung:
17-V-40-0029
weitere Vorlagen:
15-V-40-0020

Rückmeldung des Fachbereichs vom 16.01.2020



Plan 2019
7.500.000 €

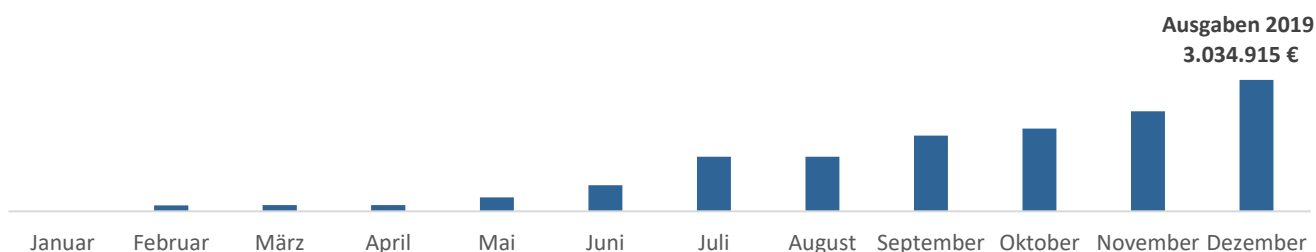

I.03767 - 40 Johannes-Maaß-Schule II. BA

2. Bauabschnitt

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Grundsatz:
18-V-40-0001

Beauftragung durch die Gremien im Rahmen des Haushaltsabschlusses.
Zur Zeit nur Planungsmittel freigegeben. Noch keine SV. Stand
06.01.2020: Plausibilitätsprüfung ist beauftragt. Projekt wird ab LPH 5
WiBau Mietmodell.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 16.01.2020



Plan 2019
2.425.000 €

Ausgaben 2019
702.673 €



I.03775 - 67 Funktionsgebäude am Kulturpark

Das Projekt befindet sich in der Konzeptionierung:

Der konkrete Bedarf an einem einzelstehenden Funktionsgebäude wird vom Schlachthof e.V. und dem Grünflächenamt derzeit nicht mehr gesehen. Deshalb laufen im Moment Abstimmungen mit Architekten und Vereinen, wie ein deutlich verkleinertes Bauwerk für die Einrichtung von öffentlichen Toiletten realisiert werden kann. Eine Machbarkeitsstudie wurde erstellt. Das weitere Vorgehen wird derzeit mit dem Kulturamt geklärt.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 17.01.2020

	veranschlagte Ausgaben	555.946 €
	Einnahmen	Zuschussbedarf
	0 €	555.946 €
		gesamte Ausgaben:
		8.187 €

Plan 2019
550.000 €

Ausgaben 2019
2.241 €

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

I.04042 - 52 SH Hermann-Ehlers-Schule Neubau

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Grundsatz:
16-V-52-0013

Die Plausibilitätsprüfung befindet sich in der Schlussphase (LPH 3). Der Bauantrag ist in Vorbereitung. Die Ausführungsvorlage soll im 1. Hj. 2020 in den Geschäftsgang gehen.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 14.01.2020



	veranschlagte Ausgaben	2.589.671 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	2.589.671 €
0 €	gesamte Ausgaben:	278.104 €

Plan 2019
2.444.713 €

Ausgaben 2019
154.900 €



I.04226 - 40 Brückenschule Sanierung

4. und 5. Bauabschnitt

Das Projekt befindet sich in der Nutzung:

1-3. BA ist abgeschlossen.
Kosten 4.+5. BA: 1.300.000 €

Grundsatz:
16-V-40-0030
Ausführung:
18-V-40-0009
weitere Vorlagen:
14-V-40-0031

Rückmeldung des Fachbereichs vom 16.01.2020



	veranschlagte Ausgaben	7.545.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	7.545.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	4.720.849 €

Plan 2019
- €

Ausgaben 2019
- €

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

I.04252 - 66 WIN Ferdinand-Knettenbrech-Weg

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Ausführung:
18-V-66-0310

Grundhafte Erneuerung des Ferdinand-Knettenbrech-Weges zwischen Deponiestraße und Betriebsgelände der Firma Knettenbrech Gurdulic; die Ausschreibung ist erfolgt, Entscheidung Verdingungskommission im Januar 2020, voraussichtlicher Baubeginn Mai 2020

Rückmeldung des Fachbereichs vom 14.01.2020



	veranschlagte Ausgaben	2.087.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	2.087.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	25.474 €

Plan 2019
2.082.780 €

Ausgaben 2019
21.254 €

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

I.04317 - 10 BGH Kastel/Kostheim Neubau

Das Projekt befindet sich in der Konzeptionierung:

Grundsatz:

15-V-10-0006

Das Projekt wird voraussichtlich erst ab 2020 bebucht, wenn die konkreten Planungskosten kassenwirksam werden. Aktuell läuft noch der Architektenwettbewerb, der über das Vorplanungsprojekt I.04488 abgewickelt wird.

weitere Vorlagen:

17-V-10-0001

Rückmeldung des Fachbereichs vom 14.01.2020



veranschlagte Ausgaben

1.100.000 €

Einnahmen

Zuschussbedarf

0 €

1.100.000 €

gesamte Ausgaben:

0 €

Plan 2019

1.100.000 €

Ausgaben 2019

- €

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

I.04342 - 52 SH Schelmengraben Generalsanierung

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Grundsatz:
19-V-52-0008

Die Grundsatzvorlage wurde am 31.10.19 bis zur Beauftragung der LPH 5 (Ausführungsplanung) beschlossen. Es erfolgt derzeit die Plausibilitätsprüfung. Der Bauantrag soll zeitnah eingereicht werden, damit im 3. Quartal 2020 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 14.01.2020



Plan 2019
910.210 €

Ausgaben 2019
93.690 €



I.04357 - 40 Ursula-Wölfel-Grundschule Neubau

Das Projekt befindet sich in der Nutzung:


GU-Verfahren, anderer Ablauf zu üblichen Baumaßnahmen: langer Planungsprozess vor Vergabe, schnelle Bauausführung, wenige Teilzahlungen, da ein Gewerk an GU. 300.000 Euro Mehrkosten Erdaushub angekündigt.

Steuerung im Rahmen der Kassenwirksamkeit.

Für diese Maßnahme wurden Gesamtkosten i.H.v. 8.300.000 € beschlossen. (mittlerweile Ursula-Wölfel-Grundschule).

Grundsatz:
16-V-40-0013
Ausführung:
16-V-40-0035

Rückmeldung des Fachbereichs vom 16.01.2020

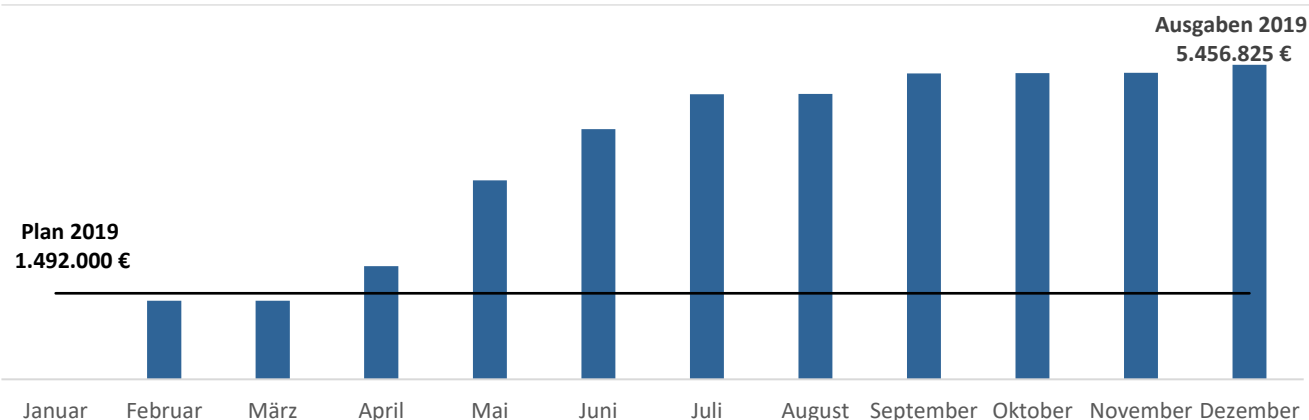

I.04358 - 51 KT Hessenring Grundsanierung

Das Projekt befindet sich in der Nutzung:

Die Maßnahme wird mit 423.658 € aus dem KIP-Programm und 320.000 € aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018" gefördert.

Seit 01.03.2019 in Betrieb.

Momentan erfolgen Restarbeiten und Mängelbeseitigung.

Ausführung:
18-V-51-0005
weitere Vorlagen:
15-V-51-0031
16-V-51-0035


Rückmeldung des Fachbereichs vom 13.01.2020



	veranschlagte Ausgaben	1.805.016 €
	Zuschussbedarf	1.805.016 €
	gesamte Ausgaben:	1.525.443 €
Einnahmen		0 €

Plan 2019
960.637 €

Ausgaben 2019
683.648 €

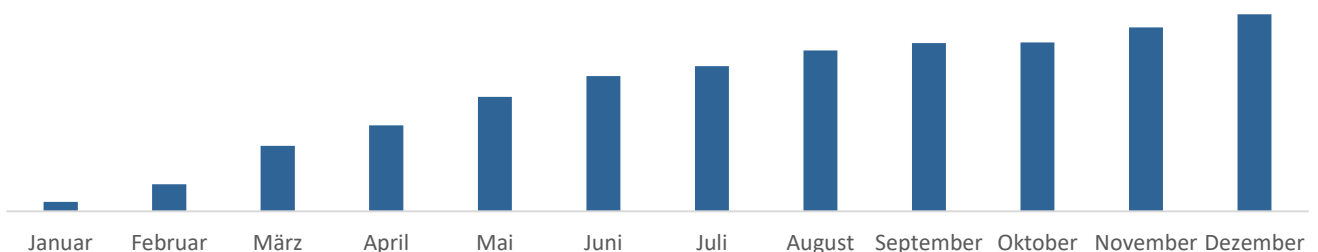

I.04446 - 23 Sanierung Gaststätte Burg Sonnenberg

1. Bauabschnitt

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Ein Teil der Maßnahmen wird bereits ausgeführt. Weitere einzelne Leistungen sind in Planung und im Vergabeverfahren, so dass die weiteren Ausführungen im laufenden Jahr anstehen.

Ausführung:
16-V-80-2335
weitere Vorlagen:
18-V-80-2316
18-V-80-2317
19-V-23-0216


Rückmeldung des Fachbereichs vom 17.01.2020



	veranschlagte Ausgaben	1.649.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	1.649.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	435.789 €

Plan 2019
1.126.549 €

Ausgaben 2019
364.339 €



I.04784 - 67 Neubau Werkstatt

Das Projekt befindet sich in der Konzeptionierung:

Die Verhandlungen für die Beschaffung von Grundstücken steht kurz vor dem Abschluss. Im Ergebnis einer durch die SEG erstellten Machbarkeitsstudie wird derzeit eine Sitzungsvorlage erstellt, mit der der notwendige Grundsatzbeschluss herbeigeführt werden soll. Nach Beschluss werden ca. 1,3 Mio Euro für die Beschaffung der notwendigen Grundstücke aufgewendet. Die verbleibenden 200.000€ werden als Anteil für die Beauftragung von notwendigen Gutachten und Planungsleistungen verwendet.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 17.01.2020



	veranschlagte Ausgaben	1.500.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	1.500.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	0 €

Plan 2019
1.500.000 €

Ausgaben 2019
- €

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

I.04791 - 67 Neubau Gärtnerunterkunft Nordfriedhof

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Grundsatz:
17-V-67-0004
Ausführung:
18-V-67-0008

Mit der Grundsatzvorlage 17-V-67-0004 und dem Beschluss 0346 vom 14.09.2017 wurde der Magistrat mit der weiteren Umsetzung beauftragt. Als Teilprojekt wurde die Ausführungsvorlage 18-V-67-0008 "Neubau Unterkunft am Nordfriedhof" in den Sitzungszug StVV am 21.06.2018 gegeben und beschlossen. Mit der Freigabe der Mittel sollen 2-stufig die Machbarkeit untersucht (MS Vorplanung) und eine Objektplanung beauftragt werden. Nach bereits erfolgter Analyse der Flächenpotentiale wurden 2-3 Varianten vertiefend untersucht. Variante 1: Neubau Unterkunft am aktuellen Standort, Variante 2: Neubau Unterkunft in der "Gebeinsfläche".

Mit der 3. Variante wurde die Unterkunft in Kombination mit einer neuen Trauerhalle untersucht. Für die 3. Variante "Neubau Unterkunft und Trauerhalle Nordfriedhof" liegt inzwischen eine überschlägige Kostenkalkulation (3.730.000 €) vor. Die Kosten für eine Generalsanierung nur der Trauerhalle betragen rund 980.000 €. Seitens des denkmalschutzes (Stadt + Land) soll die Friedhofsfläche (geschützte Gesamtanlage) möglichst nicht bebaut werden. Auch ist die Trauerhalle (von 1957) zu erhalten. Jetzt werden alternative Flächen auch im erweiterten Umfeld untersucht. Die Projektvorstellung (Dez V) überarbeitet bzw. erneut ergänzt werden. Eine Objektplanung wird voraussichtlich erst nach einer erneuten Grundsatzentscheidung (Variante Unterkunft und Trauerhalle) beauftragt werden können. Wären die Gremien (durch Einbindung der Trauerhalle) zu beteiligen, wäre eine Eintaktung in die Sitzungszüge erforderlich. Ab der Spalte "Vergabe" wird es aufgrund der Einwände denkmalschutz zu entsprechenden Verschiebungen kommen

Rückmeldung des Fachbereichs vom 17.01.2020



	veranschlagte Ausgaben	670.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	670.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	11.305 €

Plan 2019
666.232 €

Ausgaben 2019
7.537 €

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

I.04804 - 66 WIN Bierstadt Nord Baufeld 2

Das Projekt befindet sich in der Nutzung:

Ausführung:
17-V-66-0218

Anbindung des Neubaugebietes Bierstadt Nord an die B 455; Baubeginn war im Herbst 2018; Bauende war im Juni 2019; Schlussrechnungen stehen noch aus


Rückmeldung des Fachbereichs vom 14.01.2020



	veranschlagte Ausgaben	3.539.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	3.539.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	2.701.822 €

Plan 2019
2.694.428 €

Ausgaben 2019
1.857.251 €

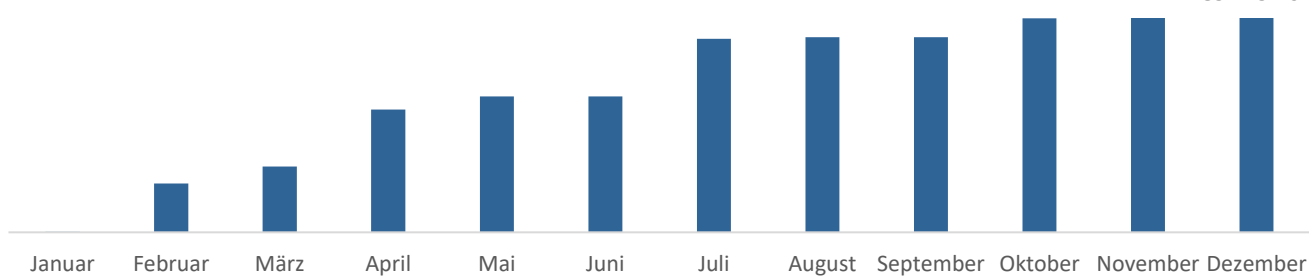

I.04822 - 52 KA Biebrich Generalsanierung SH

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Grundsatz:
17-V-52-0006

Die Ausführungsvorlage ist für Herbst 2020 geplant, Sanierungsbeginn ab Sommer 2021. Die Kostenberechnung wird derzeit ausgearbeitet.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 14.01.2020



	veranschlagte Ausgaben	7.000.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	7.000.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	9.386 €

Plan 2019
1.799.939 €

Ausgaben 2019
14.812 €

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

I.04838 - 36 Sanierung Bachkanalsystem

Das Projekt befindet sich in der Konzeptionierung:

Die Kanalbefahrungen und Auswertungen, auf deren Grundlage das Sanierungskonzept erfolgt, sind inzwischen abgeschlossen.

Die Ergebnisse liegen seit 9.01.2020 vor.

Aktuell wird eine SV für die städtischen Gremien vorbereitet, in der die Befahrungsergebnisse, das Sanierungskonzept und die Kostenschätzung dargestellt werden.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 16.01.2020



	veranschlagte Ausgaben	2.000.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	2.000.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	0 €

Plan 2019
2.000.000 €

Ausgaben 2019
- €

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

I.04861 - 40 Mosbacher Berg Neubau Verwaltung

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Grundsatz:
18-V-40-0001

Wird Mietmodell, Abschluss LPH 4 / Genehmigungsplanung, Plausi positiv, Bauantrag eingereicht, Übergabe an WiBau am 07.01.2020, Ausführungs-SV erst für Sitzungszug März möglich.


Rückmeldung des Fachbereichs vom 16.01.2020



	veranschlagte Ausgaben	1.300.000 €
Einnahmen	Zuschussbedarf	1.300.000 €
0 €	gesamte Ausgaben:	295.483 €

Plan 2019
1.878.000 €

Ausgaben 2019
264.611 €



I.04864 - 40 Martin-Niemöller-Schule Erweiterung

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Grundsatz:
18-V-40-0001

Wird Mietmodell, Aktuell LPH 2 / Entwurfsplanung, Übergabe an WiBau nach der LHP 4


Rückmeldung des Fachbereichs vom 16.01.2020



veranschlagte Ausgaben	600.000 €
Einnahmen	0 €
Zuschussbedarf	600.000 €
gesamte Ausgaben:	165.260 €

Plan 2019
500.000 €

Ausgaben 2019
158.418 €



I.04868 - 40 Grundschule Breckenheim Neubau

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Grundsatz:
18-V-40-0001


Gestartet mit der Phase 0. B-Plan frühestens Spätsommer 2020. Nach Abschluss der Leistungsphase 3 kann dadurch Wartezeit bis zur Einreichung Bauantrag entstehen. Nach Abschluss der Leistungsphase 3 geht Ausführungsvorlage in die Gremien

Rückmeldung des Fachbereichs vom 16.01.2020



Plan 2019
700.000 €

Ausgaben 2019
94.055 €



I.04913 - 66 WIN IB Brücke R+V Brücke WI 325

Das Projekt befindet sich in der Ausführung:

Ausführung:
18-V-66-0309

Erweiterung der bestehenden Fußgängerbrücke; Auftragsvergabe ist im August 2019 erfolgt; die Ausführungsplanung verzögert sich durch neue Vorgaben von Hessen Mobil, die die Brücke übernehmen werden; voraussichtlicher Baubeginn Sommer 2020

Rückmeldung des Fachbereichs vom 14.01.2020



veranschlagte Ausgaben	1.057.000 €
Einnahmen	0 €
Zuschussbedarf	1.057.000 €
gesamte Ausgaben:	72.841 €

Plan 2019
1.046.640 €

Ausgaben 2019
62.481 €



I.04956 - 66 WIN Veilchenweg/Schönaustraße - KVP

Das Projekt befindet sich in der Planung:

Ausführung:
18-V-66-0201

Einrichtung eines Kreisverkehrs am Knotenpunkt Saarstraße/Sylter Straße/Schönaustraße/Veilchenweg und benutzerfreundlicher Ausbau der Bushaltestellen "Veilchenweg" zur Entschärfung eines Unfallpunktes und Erhöhung der Verkehrssicherheit; der Baubeginn verzögerte sich durch Probleme beim Grunderwerb (Verkaufsabsicht vom Eigentümer zurückgezogen) und damit verbundene Änderungen bei der Planung; die Neuplanung wurde fertiggestellt; weitere Verzögerung durch den zwingend erforderlichen Austausch der Wasserleitungen durch Hessen Wasser; es ist eine gemeinschaftliche Ausschreibung geplant; der Austausch der Wasserleitung soll im Zeitraum August bis Oktober 2020 erfolgen, im Anschluss dann der Straßenbau; voraussichtliches Bauende Mai 2021

Rückmeldung des Fachbereichs vom 14.01.2020



Plan 2019
970.940 €

Ausgaben 2019
29.145 €

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

I.05053 - 51 Soziale Stadt STZ Gräselberg Neubau

Das Projekt befindet sich in der Konzeptionierung:

Grundsatz:
19-V-51-0015

Das Projekt - Neubau STZ Gräselberg - wird durch die SEG im Rahmen der Sozialen Stadt abgewickelt. Durch das Land wurden auf der Grundlage der Förderanträge 2017 bis 2019 zunächst Gesamtausgaben in Höhe von 5,580 Mio € bewilligt. Das Raumkonzept für den Neubau steht. Die Machbarkeitsuntersuchung zur Realisierung der Baumaßnahme in Kombination mit einem Eltern_Kind Zentrum / -Pension auf der Brachfläche Pörschacher Straße ist abgeschlossen. Mit Beschluss Nr. 19-V-51-0035 vom 31.10.2019 hat die Stadtverordnetenversammlung dem Bauvorhaben grundsätzlich zugestimmt und Dez. VI/51 ermächtigt, die Planung und Durchführung zu beauftragen. Der geschätzte Kostenrahmen für die Baumaßnahme (nach BKI-Kennwerten) beläuft sich auf 6,15 Mio €. Im städtischen Haushalt stehen bis einschließlich 2019 2,55 Mio € zur Verfügung. Zum Haushalt 2020/21 wurden weitere 3,4 Mio € angemeldet.

Rückmeldung des Fachbereichs vom 13.01.2020



	veranschlagte Ausgaben	2.550.000 €
	Einnahmen	1.600.000 €
	Zuschussbedarf	950.000 €
	gesamte Ausgaben:	0 €

Plan 2019
2.550.000 €

Ausgaben 2019
- €

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
