



AUSSCHUSS FÜR MOBILITÄT

Vorstellung der Projekte Welfenstraße und Schiersteiner Straße

Agenda


1. Vorstellung Schiersteiner Straße
2. Vorstellung Welfenstraße

Umlegungen in der Schiersteiner Straße



- ELW plant Erstellung eines Schachtbauwerks
 - Ausführung soll 2026 statt finden
- Von Seiten ESWE Versorgung sind hierfür im Jahr 2025 vorbereitende Maßnahmen notwendig:
- Umlegung Wasserleitung
 - Umlegung Gasniederdruckleitung

Schiersteiner Straße

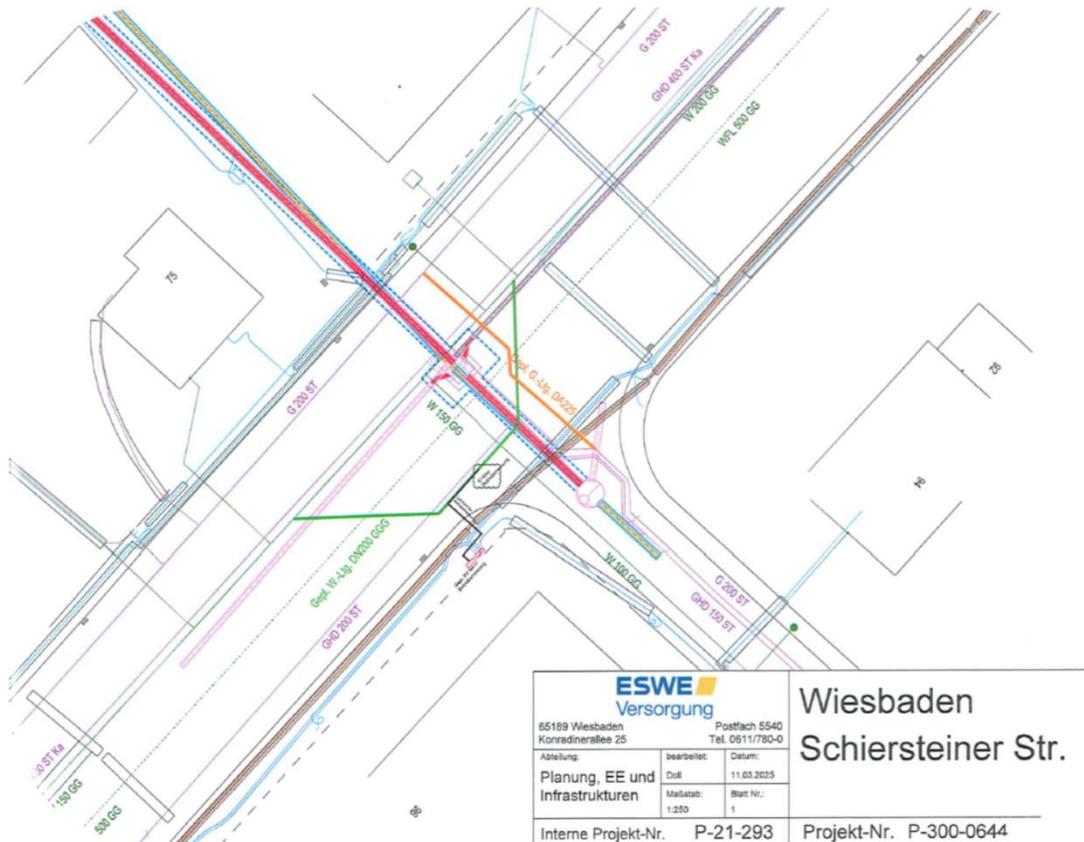

Bauphase 1: 29.06.25-02.07.25

- Umbau Mittelinsel

Bauphase 2: 03.07.25-22.07.25

- Tiefbau und Rohrbau stadteinwärts

Bauphase 3: 23.07.25-31.07.25

- Tiefbau und Rohrbau beide Fahrrichtungen

Bauphase 4: 01.08.25-11.08.25

- Tiefbau und Rohrbau stadtauswärts

Bauphase 5: 12.08.25-17.08.25

- Rückbau Mittelinsel


Es steht min. eine Fahrspur in jede Fahrtrichtung zur Verfügung

VZP Schiersteiner Str.


Bauphase 1: 29.06.25-02.07.25



Bauphase 2: 03.07.25-22.07.25


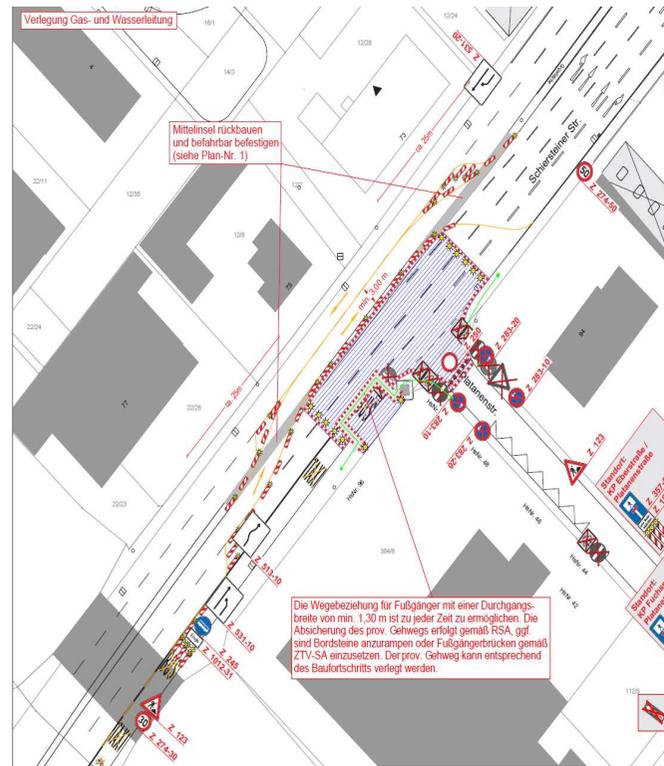


Bauphase 3: 23.07.25-31.07.25

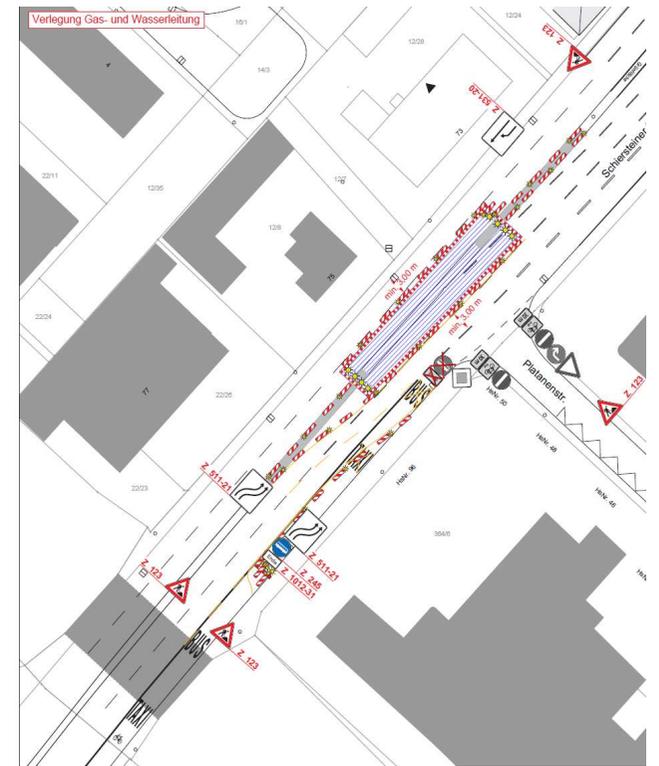

Erneuerung der Wasserleitung Welfenstraße


- Graugussleitung aus dem Jahr 1896
- Mehrfache Auffälligkeiten durch Störungen
- Austausch von ca. 530m Versorgungsleitung
 - 260m bereits fertiggestellt
 - 80m im Bau
 - In den Sommerferien Bau der restlichen 160m + Einbindung in die Mainzer Straße
 - Parallel mit Maßnahme der ELW in der Mainzer Str.

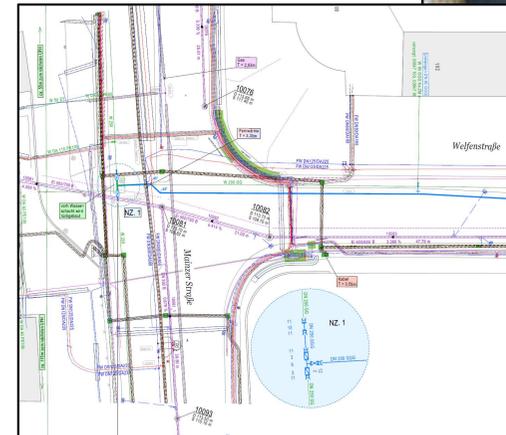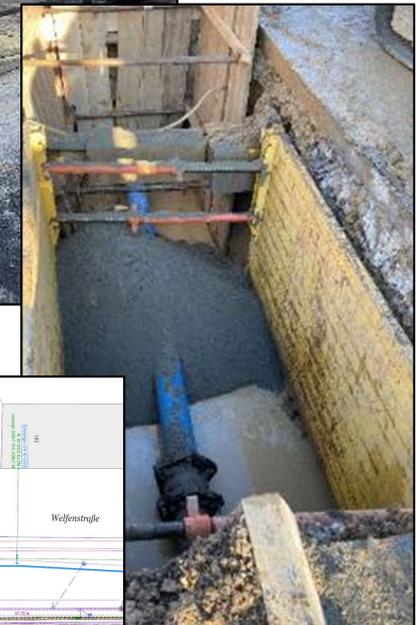


Es steht min. eine Fahrspur in jede Fahrtrichtung zur Verfügung

VZP Welfenstr. / Mainzer Str.


Bauphase 1: 05.07.25-19.07.25

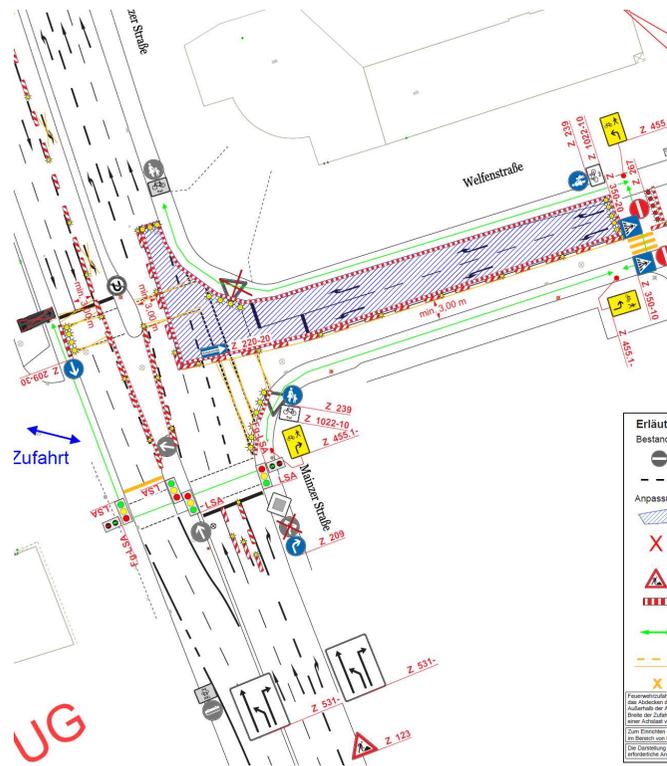

Bauphase 2: 20.07.25-02.08.25

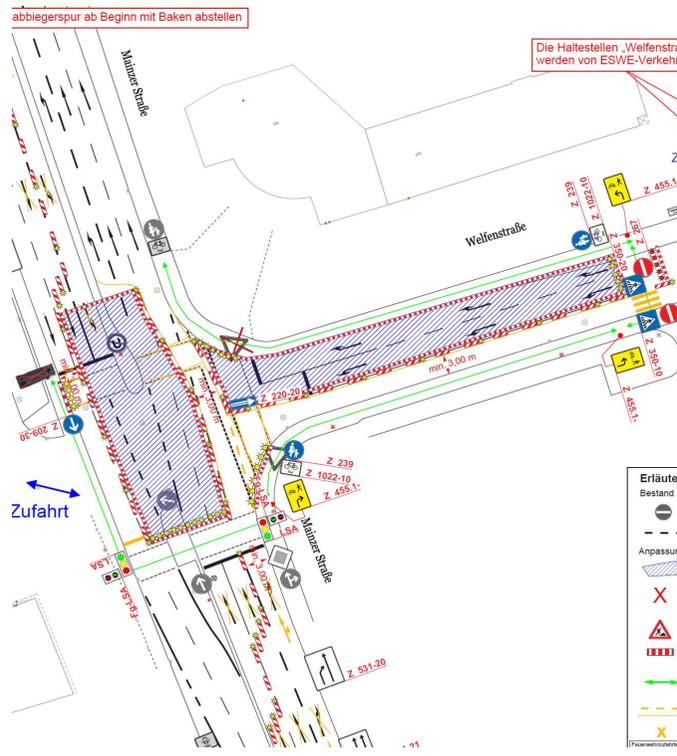

Bauphase 3: 02.08.25-16.08.25

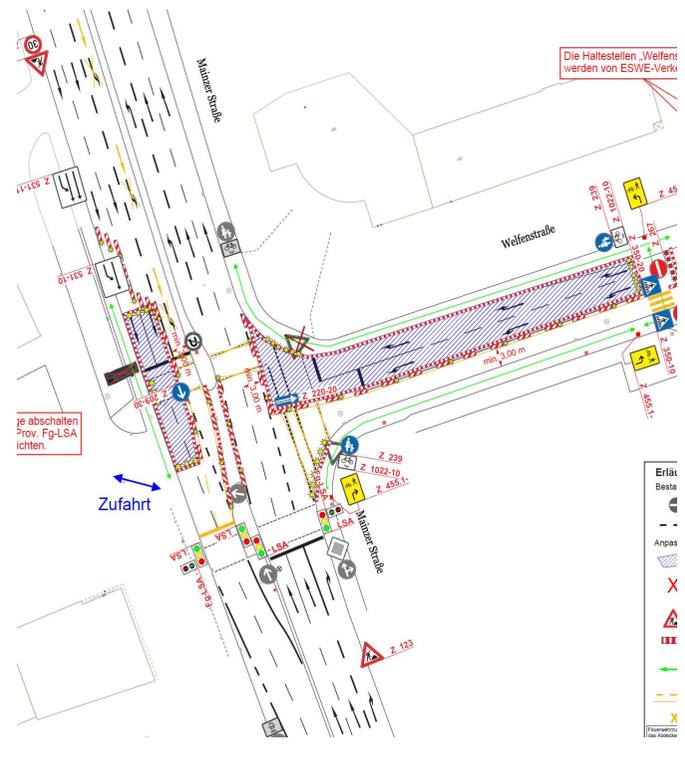

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt:

Felix-Wolfgang Heyer
Leiter Netzbau und -instandsetzung
Konradinallee 25, 65189 Wiesbaden
Tel.: 0611/ 780-3278
E-Mail: felix-wolfgang.heyer@eswe.com
