Rahmenterminplan **- Neubau Fritz Gansberg Schule bei gleichbleibendem Raumprogramm 3 - zügig -**

Stand: 06.04.2017

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende
1	**Stadtverordnetenbeschluß Beschleunigte Umsetzung**	Do 18.05.17	Do 18.05.17
2	Beauftragung Generalplaner LPH 3 + 4	Mo 22.05.17	Fr 26.05.17
3	Beginn LPH 3 bei gleichem Raumprogramm	Mo 29.05.17	Mo 29.05.17
4	Ausführung LPH 3	Mo 29.05.17	Fr 13.10.17
5	Plausibilitätsprüfung	Mo 25.09.17	Fr 20.10.17
6	Erstellen der Ausführungsvorlage	Mo 09.10.17	Fr 20.10.17
7	Abstimmung Ausf. Vorlage (40, 14, 64) + Unterschriften	Mo 23.10.17	Fr 27.10.17
8	Bauantrag erstellen	Mo 23.10.17	Fr 08.12.17
9	Einreichen der Ausführungsvorlage im Magistratsbüro	Di 31.10.17	Di 31.10.17
10	**Magistratsbeschluß TO C Ausführungsvorlage**	Di 14.11.17	Di 14.11.17
11	Ortsbeiratsbeschluß Südost Sondersitzung	Do 23.11.17	Do 23.11.17
12	**Magistratsbeschluß TO A Ausführungsvorlage**	Di 28.11.17	Di 28.11.17
13	Bauantrag einreichen	Mo 11.12.17	Mo 11.12.17
14	Bauantrag prüfen, Bauaufsicht	Mo 11.12.17	Fr 29.06.18
15	**Stadtverordnetenbeschluß Ausführungsvorlage**	Do 21.12.17	Do 21.12.17
16	Beauftragung Generalplaner LPH 5-9	Mo 08.01.18	Fr 12.01.18
17	Ausführungsplanung / Ausschreibungen / Vergabe	Mo 15.01.18	Fr 08.03.19
18	**Baugenehmigung Neubau**	Mo 02.07.18	Mo 02.07.18
19	Baumfällarbeiten	Mo 01.10.18	Fr 19.10.18
20	**Baubeginn Neubau**	Mo 22.10.18	Mo 22.10.18
21	Ausführung	Mo 22.10.18	Fr 19.06.20
22	Inbetriebnahme, Haustechnik etc.	Mo 22.06.20	Fr 31.07.20
23	Sommerferien	Mo 06.07.20	Fr 14.08.20
24	**Übergabe Gebäude**	Mo 03.08.20	Mo 03.08.20

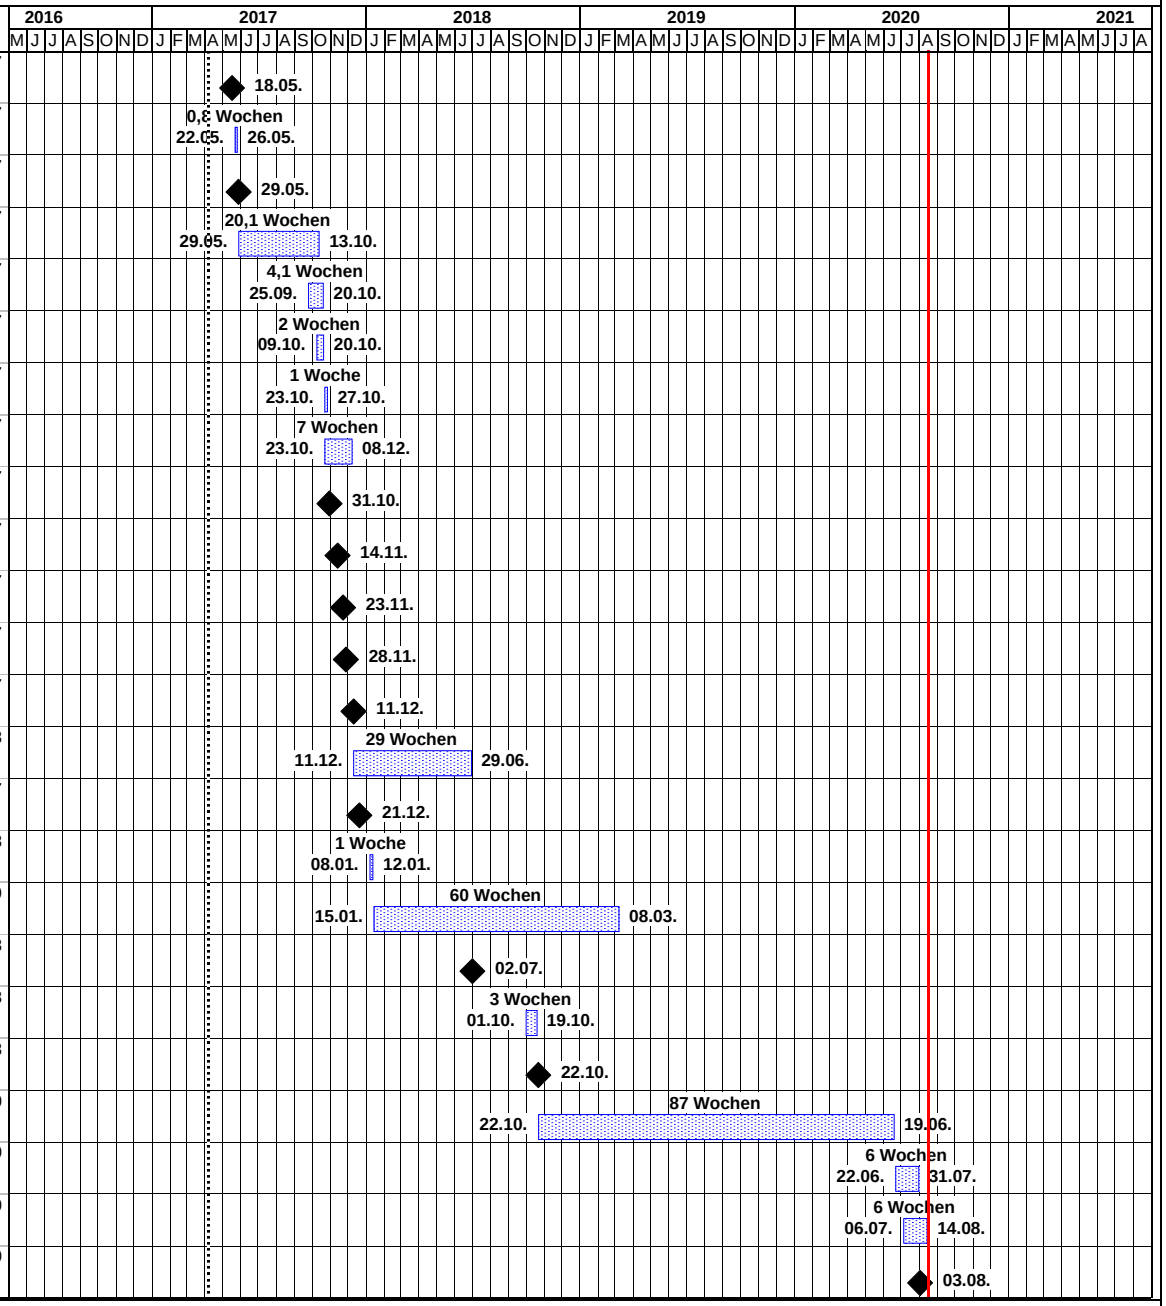

Die Endtermine sind abhängig von den Beschlußterminen Magistrat, Ortsbeirat und Stadtverordnetenversammlung
