Nr.	Vorgangsn	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1		**vorlauf**	**1 Tag**	**Don 14.09.17**	**Don 14.09.17**	
2		start genehmigungsplanung	1 Tag	Don 14.09.17	Don 14.09.17	
3		stadtverordnetenvers.	1 Tag	Don 14.09.17	Don 14.09.17	
4		**bauherr**	**81 Tage**	**Fre 15.09.17**	**Mon 22.01.18**	
5		freigabe zur ausführung	11 Tage	Fre 15.09.17	Fre 29.09.17	2
6		einreichung bauantrag	10 Tage	Die 09.01.18	Mon 22.01.18	12
7		**bauaufsicht**	**201 Tage**	**Fre 15.09.17**	**Die 17.07.18**	
8		vorabstimmung	11 Tage	Fre 15.09.17	Fre 29.09.17	5AA
9		bauantragsverfahren	6 Monate	Die 23.01.18	Die 17.07.18	6
10		baugenehmigung	1 Tag	Die 17.07.18	Die 17.07.18	9EE
11		**architekt**	**370 Tage**	**Mon 02.10.17**	**Mon 08.04.19**	
12		genehmigungsplanung	3 Monate	Mon 02.10.17	Mon 08.01.18	5
13		werkplanung	10 Monate	Die 09.01.18	Mit 24.10.18	12
14		detailplanung	10 Monate	Die 20.03.18	Mon 14.01.19	13AA+50 Tage
15		erstellung lvs I	3 Monate	Don 05.04.18	Die 03.07.18	13AA+60 Tage
16		ausschreibung / vergabe I	3 Monate	Mit 04.07.18	Die 25.09.18	15
17		erstellung lvs II	40 Tage	Mit 18.07.18	Die 11.09.18	15EA+10 Tage
18		ausschreibung / vergabe II	3 Monate	Mit 12.09.18	Mit 05.12.18	17
19		erstellung lvs III	30 Tage	Mit 26.09.18	Mit 07.11.18	17EA+10 Tage
20		ausschreibung / vergabe III	4 Monate	Don 08.11.18	Mon 11.03.19	19
21		erstellung lvs IV	30 Tage	Don 22.11.18	Mon 14.01.19	19EA+10 Tage
22		ausschreibung / vergabe IV	3 Monate	Die 15.01.19	Mon 08.04.19	21
23		**bodengutachter**	**30 Tage**	**Die 20.11.18**	**Don 10.01.19**	
24		baubegleitende unters.	30 Tage	Die 20.11.18	Don 10.01.19	61AA
25		**tragwerk**	**310 Tage**	**Mon 02.10.17**	**Mon 14.01.19**	
26		genehmigungsstatik	100 Tage	Mon 02.10.17	Mon 05.03.18	5
27		mitwirkung lvs	10 Tage	Don 26.04.18	Fre 11.05.18	15AA+15 Tage
28		mitwirkung durchbrüche	20 Tage	Die 20.03.18	Mit 18.04.18	37AA
29		erstellung schalpläne	24 Wochen	Mit 06.06.18	Mit 21.11.18	13AA+100 Tage
30		erstellung bewehrungsplän	24 Wochen	Mit 18.07.18	Mon 14.01.19	29AA+6 Wochen
31		**prüfstatik**	**230 Tage**	**Die 23.01.18**	**Mit 19.12.18**	
32		prüfung stat. berechnung	100 Tage	Die 23.01.18	Die 19.06.18	26EA-30 Tage
33		prüfung s+b pläne	5 Monate	Mit 01.08.18	Mit 19.12.18	29AA+8 Wochen
34		**hls-planung**	**290 Tage**	**Mon 02.10.17**	**Mit 05.12.18**	
35		genehmigungsplanung	40 Tage	Mon 02.10.17	Mon 27.11.17	12AA
36		werkplanung	7,5 Monate	Die 20.02.18	Die 25.09.18	13AA+30 Tage
37		angabe durchbrüche	20 Tage	Die 20.03.18	Mit 18.04.18	36AA+20 Tage
38		erstellung lvs I	3 Monate	Don 05.04.18	Die 03.07.18	15AA
39		ausschreibung / vergabe I	3 Monate	Mit 04.07.18	Die 25.09.18	38
40		erstellung lvs II	40 Tage	Mit 18.07.18	Die 11.09.18	17AA
41		ausschreibung / vergabe II	3 Monate	Mit 12.09.18	Mit 05.12.18	40
42		**elektroplanung**	**150 Tage**	**Die 20.02.18**	**Die 25.09.18**	
43		werkplanung	7,5 Monate	Die 20.02.18	Die 25.09.18	13AA+30 Tage
44		angabe durchbrüche	20 Tage	Die 20.03.18	Mit 18.04.18	43AA+20 Tage
45		erstellung lvs I	3 Monate	Don 05.04.18	Die 03.07.18	15AA
46		ausschreibung / vergabe I	3 Monate	Mit 04.07.18	Die 25.09.18	45
47		**bauphysik**	**653 Tage**	**Mon 02.10.17**	**Mit 27.05.20**	
48		nachweise zum bauantrag	3 Monate	Mon 02.10.17	Mon 08.01.18	12AA
49		mitwirkung werk- u. det.pl.	7,5 Monate	Die 20.03.18	Mit 24.10.18	13AA+50 Tage
50		mitwirkung lvs	7,5 Monate	Don 05.04.18	Mit 07.11.18	15AA
51		mitwirkung ausführung	13 Monate	Mit 15.05.19	Mit 27.05.20	61
52		**brandschutz**	**653 Tage**	**Mon 02.10.17**	**Mit 27.05.20**	
53		genehmigungsplanung	3 Monate	Mon 02.10.17	Mon 08.01.18	12AA
54		mitwirkung werk- u. det.pl.	7,5 Monate	Die 20.03.18	Mit 24.10.18	13AA+50 Tage
55		mitwirkung ausführung	13 Monate	Mit 15.05.19	Mit 27.05.20	61
56		**freianlagenplanung**	**220 Tage**	**Die 16.10.18**	**Mon 09.09.19**	
57		werkplanung	5 Monate	Die 16.10.18	Fre 15.03.19	58AE
58		erstellung lv	3 Monate	Fre 15.03.19	Fre 14.06.19	59AE
59		ausschreibung / vergabe	3 Monate	Fre 14.06.19	Mon 09.09.19	65AE-80 Tage
60		**bauausführung**	**375 Tage**	**Die 20.11.18**	**Mit 27.05.20**	
61		rohbau und dach	5,75 Monate	Die 20.11.18	Die 14.05.19	16EA+38 Tage
62		fenster und fassade	4 Monate	Mit 15.05.19	Fre 06.09.19	61
63		haustechnik	6 Monate	Mon 26.08.19	Don 13.02.20	62EA-10 Tage
64		innenausbau	5 Monate	Fre 03.01.20	Mit 27.05.20	63EA-30 Tage
65		freianlagen	5 Monate	Fre 03.01.20	Mit 27.05.20	64EE
66		fertigstellung gebäude	1 Tag	Mit 27.05.20	Mit 27.05.20	64EE
67		fertigstellung freianlagen	1 Tag	Mit 27.05.20	Mit 27.05.20	66EE
68		**inbetriebnahme**	**55 Tage**	**Don 28.05.20**	**Fre 14.08.20**	
69		mängelbeseitigung	15 Tage	Don 28.05.20	Fre 19.06.20	64
70		inbetriebnahme	10 Tage	Mon 22.06.20	Fre 03.07.20	69
71		umzug	30 Tage	Mon 06.07.20	Fre 14.08.20	72AA
72		sommerferien 2020	30 Tage	Mon 06.07.20	Fre 14.08.20	

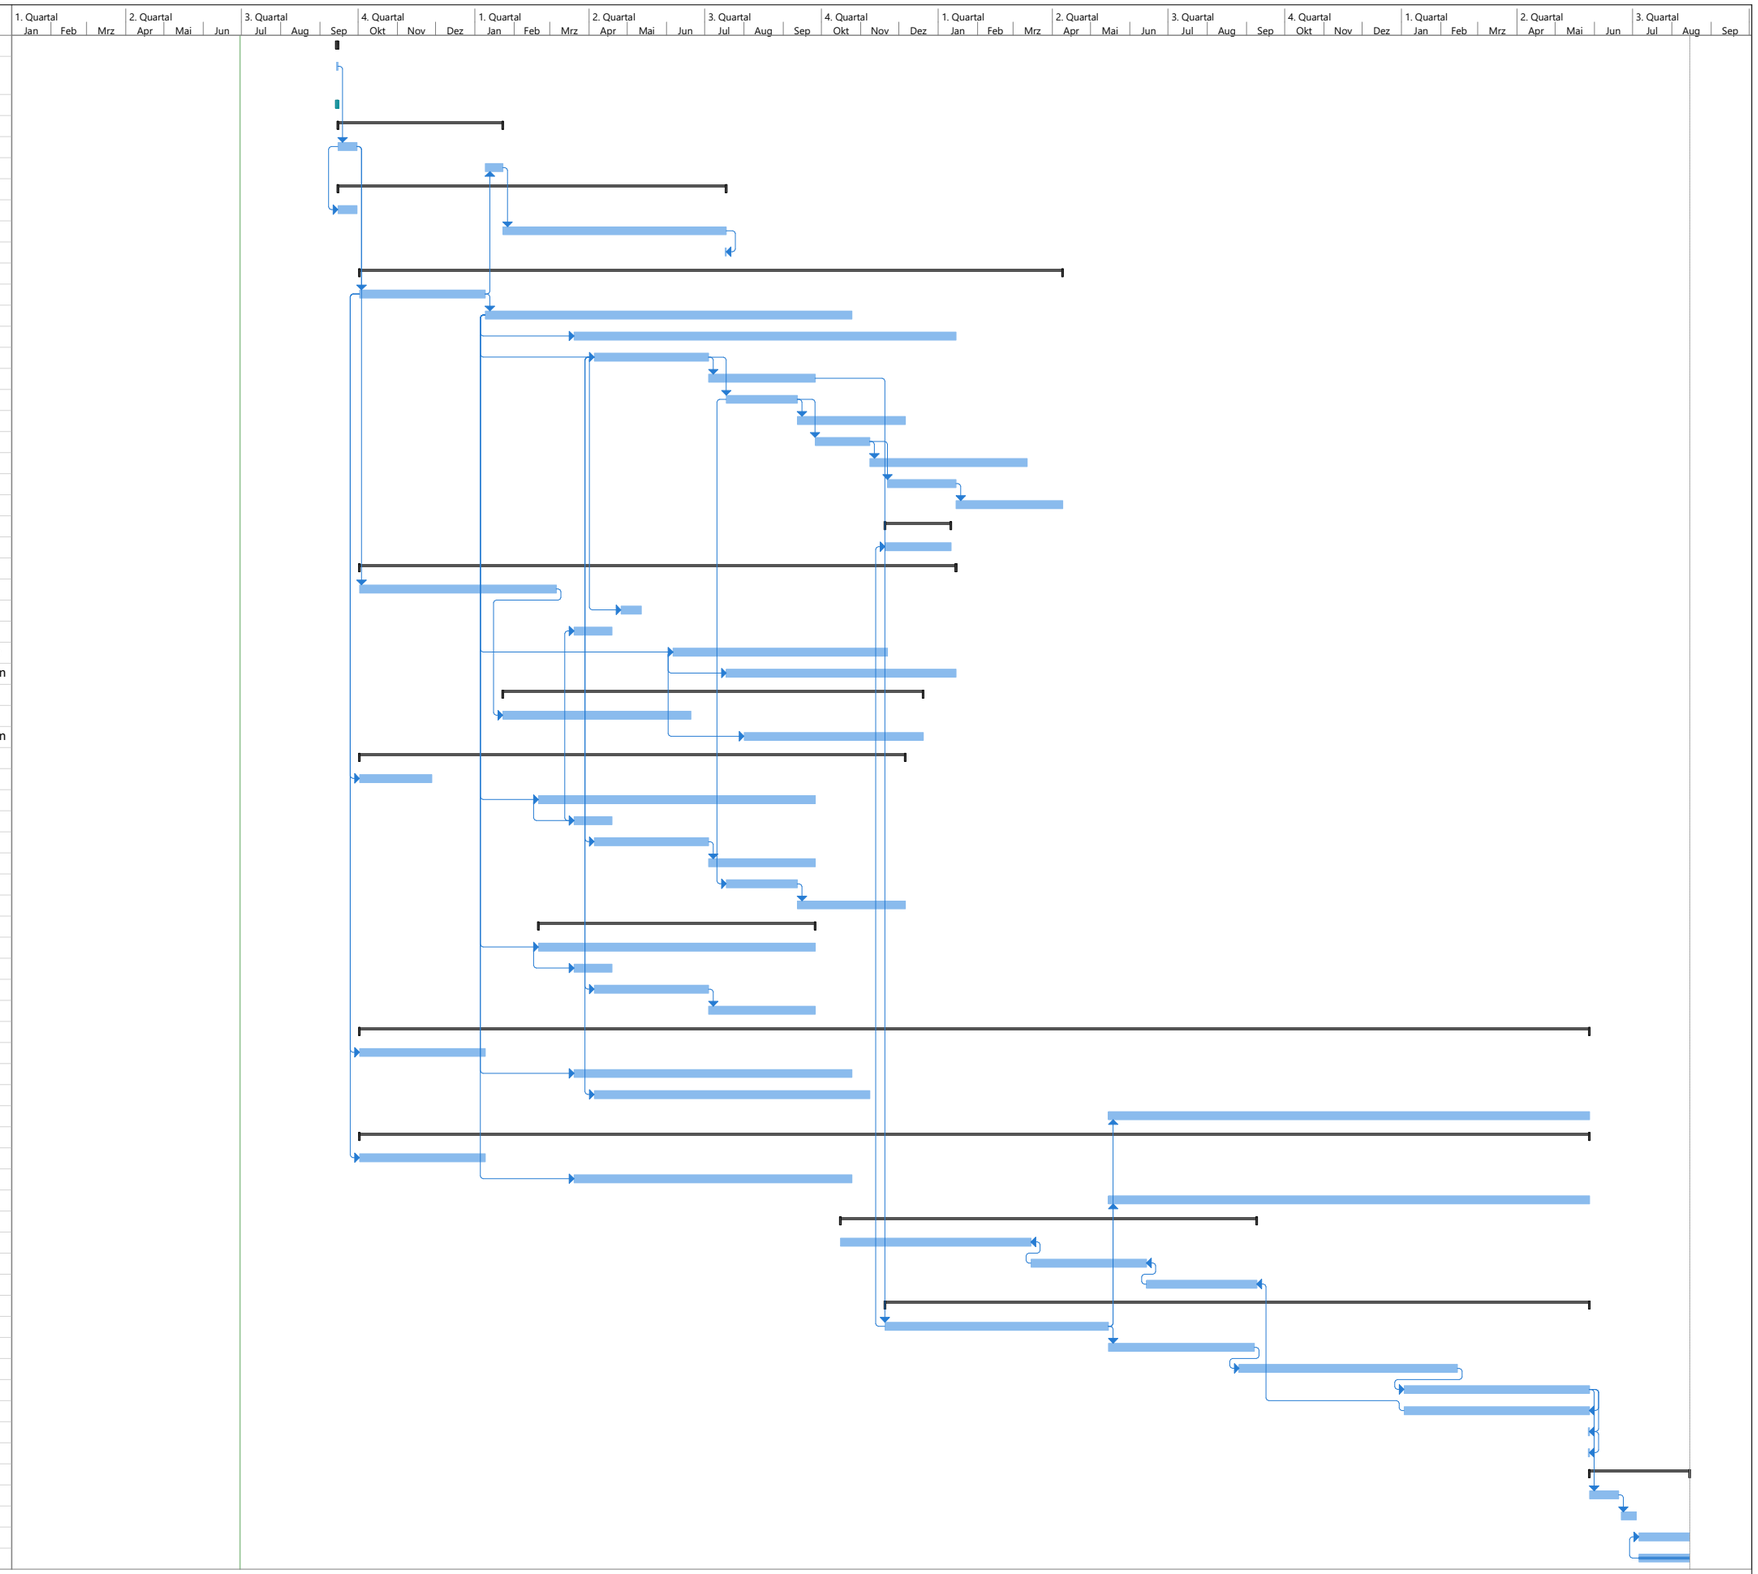

Projekt: 170630-terminplan-cv
Datum: Fre 30.06.17

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt
