ESS, Elisabeth-Selbert-Schule mit 2-Feld Sporthalle

Stand 24.02.2021

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1	**ESS - Zeitrahmen Vorabmaßnahme**	**1063 Tage?**	**Mon 23.09.19**	**Fre 21.07.23**		
32	**Voraussetzungen für kurzfristige Umsetzung**	**1098 Tage**	**Mon 30.09.19**	**Fre 01.09.23**		
33	Planung, LP 1-4, Abstimmungen Behörden	85 Tage	Mon 30.09.19	Fre 24.01.20		Planung, LP 1-4, Abs
34	Vorlage Kostenschätzung	1 Tag	Mon 02.12.19	Mon 02.12.19		
35	StVV Ausführungsbeschluss	1 Tag	Don 13.02.20	Don 13.02.20		
36	40 / WiBau Mietvertrag bis 11.03.2020	1 Tag	Mit 11.03.20	Mit 11.03.20		
37	LP 5-7, Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe	67 Tage	Mon 20.01.20	Fre 17.04.20		LP 5-7, Ausführungsp
38	1. BA - Verkürzte Genehmigungsphase	50 Tage	Mon 27.01.20	Fre 03.04.20	33	1. BA - Verkürzte Ge
39	1. BA, Puffer Genehmigungsphase bis 30.04.2020	21 Tage	Mon 06.04.20	Don 30.04.20		1. BA, Puffer Genehn
40	Vorlaufzeit Ausführende	10 Tage	Mon 20.04.20	Fre 01.05.20		Vorlaufzeit Ausführer
41	Vorlaufzeit Ausführender Raummodule	47 Tage	Mon 30.03.20	Fre 29.05.20		Vorlaufzeit Ausführer
42	1. BA - LP 8, Herstellen Geländeflächen, Außenanlagen, Medien	78 Tage	Mon 04.05.20	Fre 07.08.20	40	1. BA - LP 8, Herstell
43	1. BA - LP 8, Stellung Raummodule Gebäude A+C	37 Tage	Mit 10.06.20	Fre 24.07.20	41	1. BA - LP 8, Stellung
44	1. BA - Möblierung, Ausstattung, Vorbereitung Schulbeginn	33 Tage	Mon 13.07.20	Fre 14.08.20		1. BA - Möblierung, A
45	Schulbeginn SJ 2020/21	1 Tag	Mon 17.08.20	Mon 17.08.20		Erschließung, Medier
46	Unterricht in Raummodulen Geb. A+C	249 Tage	Mon 17.08.20	Fre 16.07.21		Unterricht in Raumm
47	2. BA - Einreichen Bauantrag	1 Tag	Fre 30.10.20	Fre 30.10.20		
48	2. BA - Genehmigungsphase	69 Tage	Mon 02.11.20	Fre 29.01.21		2. BA - Genehmigung
49	2. BA - LP 8, Gelände, Außenanlagen, Gebäude B 1. Erweiterung	164 Tage	Mon 04.01.21	Mon 09.08.21		2. BA - LP 8, Gelände,
50	2. BA - Möblierung, Ausstattung, Vorbereitung Schulbeginn	33 Tage	Mon 26.07.21	Fre 27.08.21		2. BA - Möblierung, A
51	Schulbeginn SJ 2021/22	1 Tag	Mon 30.08.21	Mon 30.08.21		
52	Unterricht in Raummodulen Geb. B - 1. Erweiterung	243 Tage	Mon 30.08.21	Fre 22.07.22		Unterricht in Raumm
53	Stellung Raummodule Geb. B - 2. Erweiterung	36 Tage	Mon 11.07.22	Fre 19.08.22		Stellung Raummodul
54	Möblierung, Ausstattung, Vorbereitung Schulbeginn	12 Tage	Mon 22.08.22	Fre 02.09.22		Möblierung, Ausstattu
55	Schulbeginn SJ 2022/23	1 Tag	Mon 05.09.22	Mon 05.09.22		
56	Unterricht in Raummodulen Geb. B - 2. Erweiterung	238 Tage	Mon 05.09.22	Fre 21.07.23		Unterricht in Raumm
57	Abbau Container	30 Tage	Mon 24.07.23	Fre 01.09.23	56	Abbau Container
58						
59	**ESS- Zeitrahmen 1. BA mit erforderlicher B-Plan Änderung**	**1709 Tage**	**Die 01.10.19**	**Mit 31.12.25**		
60	VGV Planer, 4 Monate	89 Tage	Die 01.10.19	Fre 31.01.20		VGV Planer, 4 Monat
61	Planung, LP 1-2	127 Tage	Don 06.02.20	Fre 31.07.20	60	Planung, LP 1-2
62	Planung, LP 3, 5 Monate	119 Tage	Don 24.09.20	Fre 26.02.21		Planung, LP 3, 5 Mor
63	Planung, LP 4, 1 Monat	23 Tage	Mon 01.03.21	Mit 31.03.21		Planung, LP 4, 1 Mor
64	Plausibilisierung	48 Tage	Mon 11.01.21	Mit 17.03.21		Plausibilisierung
65	Qualifizierter Aufstellungsbeschluss spätestens, gem. SV 20-V-40-0004	1 Tag	Don 10.12.20	Don 10.12.20		Qualifizierter Aufstellungsbeschlus
66	**Bearbeitungszeit FNP und B-Plan Änderung - 15,5 Monate**	**316 Tage**	**Mon 27.04.20**	**Die 15.06.21**		**Bearbeitungszeit FN**
83	Einreichen Bauantrag	1 Tag	Don 01.04.21	Don 01.04.21		Einreichen Bauantrag
84	Genehmigungsphase, 6 Monate	144 Tage	Don 01.04.21	Fre 01.10.21		Genehmigungsphase
85	Planung, LP 5-6, vorab der Beschlussfassung	61 Tage	Mon 01.03.21	Don 20.05.21	62	Planung, LP 5-6, vora
86	Planung, LP 5-6 (ab Oktober 2021 baubegleitend)	308 Tage	Fre 21.05.21	Don 30.06.22	85	Planung, LP 5-6 (ab (
87	Vorbereitung STVV Ausführungsbeschluss (Sitzung 20.05.21)	47 Tage	Don 18.03.21	Mit 19.05.21	64	Vorbereitung STVV A
88	STVV Ausführungsbeschluss	1 Tag	Don 20.05.21	Don 20.05.21		STVV Ausführungsbe
89	Mietvertrag 40 / WiBau	1 Tag	Fre 21.05.21	Fre 21.05.21		Mietvertrag 40 / WiBa
90	Baugenehmigung erforderlich	1 Tag	Fre 02.07.21	Fre 02.07.21		Baugenehmigung erf
91	VOB/A + VOB/B Ausschreibungen baubegleitend ab Oktober 2021, Vergaben, LP 6-7	421 Tage	Mon 05.07.21	Sam 31.12.22		VOB/A + VOB/B Ausschreibungen
92						
93	LV Erstellungen für Vorbereitende Maßnahmen, Erd- und Rohbau (tlw. VOB/A)	64 Tage	Mon 26.07.21	Mon 11.10.21		LV Erstellungen für Vorbereitende
94	Ausführung Vorbereitende Maßnahmen, Erd- u. Verbauarbeiten, BE Einrichtung	106 Tage	Mon 04.10.21	Fre 18.02.22	84	Ausführung Vorbereitende
95	BAUTEIL A Ausführung	598 Tage	Mon 21.02.22	Don 18.04.24		BAUTEIL A Ausführu
96	BAUTEIL F Ausführung	598 Tage	Mon 21.02.22	Don 18.04.24		BAUTEIL F Ausführu
97	BAUTEIL D Ausführung	598 Tage	Mon 21.02.22	Don 18.04.24		BAUTEIL D Ausführu
98	BAUTEIL A+F+D Möblierung	15 Tage	Mon 25.03.24	Fre 12.04.24		BAUTEIL A+F+D Mö
99	**Aufnahme Schulbetrieb BT A+F+D nach Ostern 2024**	1 Tag	Don 18.04.24	Don 18.04.24		
100	Standzeitverlängerung Interim Gebäude A+C (9 Monate)	209 Tage	Mon 24.07.23	Fre 19.04.24		Standzeitverlängerun
101	Abbau Interim Gebäude A+C	15 Tage	Mon 22.04.24	Fre 10.05.24		Abbau Interim Gebäu
102	BAUTEIL C Ausführung	690 Tage	Mon 21.02.22	Mon 26.08.24		BAUTEIL C Ausführu
103	BAUTEIL C Möblierung	15 Tage	Mon 05.08.24	Fre 23.08.24		BAUTEIL C Möblieru
104	**Aufnahme Schulbetrieb BT C zum Schuljahr 2024/25**	1 Tag	Mon 26.08.24	Mon 26.08.24		
105	BAUTEIL B Ausführung (ANNAHME)	218 Tage	Mon 01.07.24	Mit 30.04.25	101	BAUTEIL B Ausführu
106	**Aufnahme Schulbetrieb BT B nach Ostern 2025 (ANNAHME)**	1 Tag	Fre 02.05.25	Fre 02.05.25		
107	Standzeitverlängerung Interim Gebäude B (12 Monate)	279 Tage	Mon 24.07.23	Fre 26.07.24		Standzeitverlängerun
108	Abbau Interim Gebäude B	20 Tage	Mon 29.07.24	Fre 23.08.24		Abbau Interim Gebäu
109	BAUTEIL E inkl. Hofflächen Ausführung	353 Tage	Mon 26.08.24	Mit 31.12.25		BAUTEIL E inkl. Hoff
110	**Projektfertigstellung**	1 Tag	Mit 31.12.25	Mit 31.12.25		

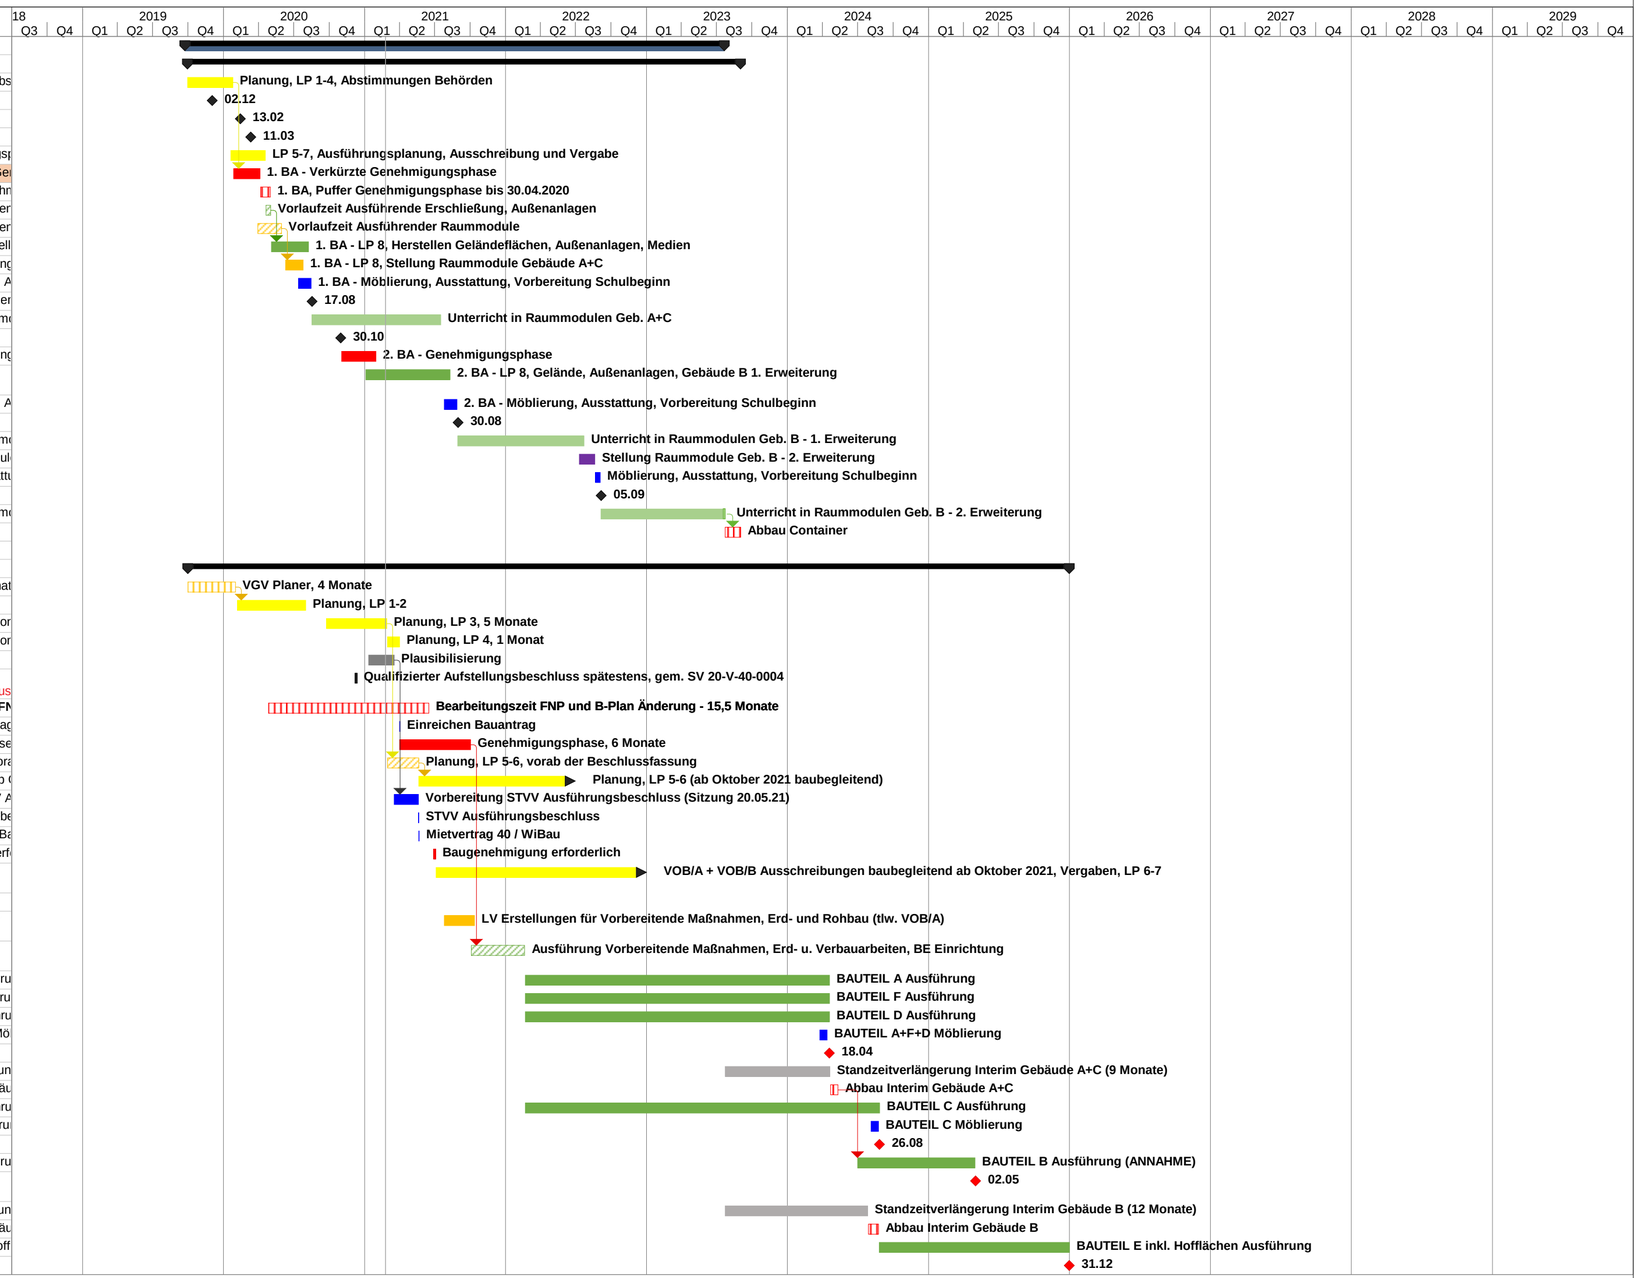

Projekt: Elisabeth-Selbert-Schule mit 2-Feld Sporthalle

Datum: Mit 24.02.21

Vorgang	Sammelvorgang	Externer Meilenstein	Manueller Vorgang	Manueller Sammelvorgang	Externe Vorgänge	Stichtag	
Unterbrechung	Projektsammelvorgang	Inaktiver Meilenstein	Nur Dauer	Nur Anfang	Externer Meilenstein		
Meilenstein	Externe Vorgänge	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelrollup	Nur Ende	In Arbeit		
