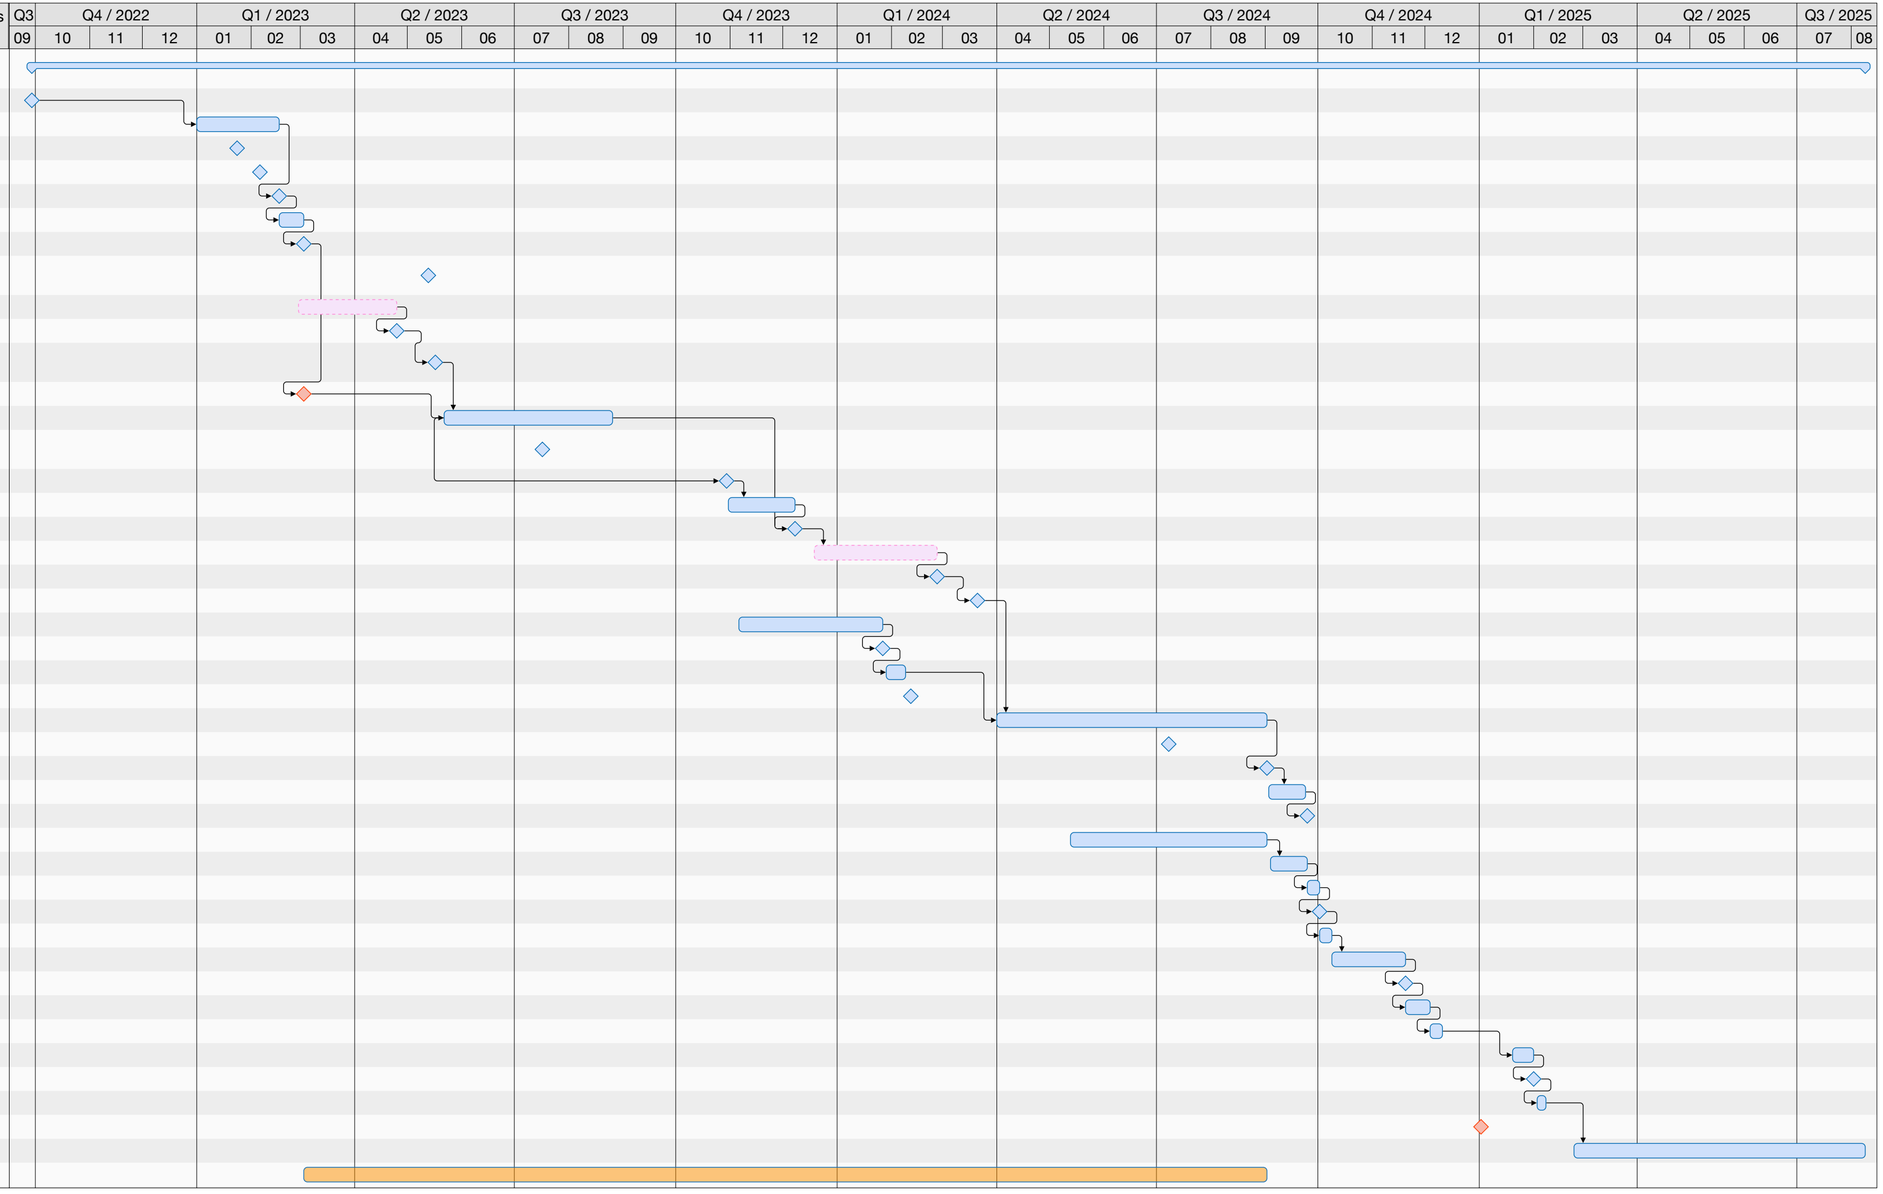#	Info	Titel	Vorgabe Arbeit	Erwartete Dauer	Erwarteter Start	Erwartetes Ende
0		**255_WI_Elsässer Platz Rahmenterminplan**		**3,11 Jahre**	**29.09.2022**	**08.08.2025**
1		Beauftragung			29.09.2022	29.09.2022
2		**Vorplanung (LPH 2)**		**1,7 Monate**	**01.01.2023**	**17.02.2023**
3		Koordinationstermin Leitungsträger			24.01.2023	24.01.2023
4		Vorstellung Vorentwurf (Ämterrunde)			06.02.2023	06.02.2023
5		Abgabe Vorplanung (Vorabzug)			17.02.2023	17.02.2023
6		Prüfung Vorplanung AG		2 Wochen	17.02.2023	02.03.2023
7		Freigabe Vorplanung			03.03.2023	03.03.2023
8		Ortstermin (Abstecken, Präsentation) Tag der Städtebauförderung			13.05.2023	13.05.2023
9		Vorlaufzeit Magistratssitzung		2 Monate	28.02.2023	24.04.2023
10		Grundsatzgenehmigung (Magistrat)			25.04.2023	25.04.2023
11		Grundsatzgenehmigung (Stadtverortnetenversammlung)			17.05.2023	17.05.2023
12		Beauftragung Fachplaner Entwässerung			03.03.2023	03.03.2023
13		**Entwurfsplanung (LPH 3)**		**3,5 Monate**	**22.05.2023**	**25.08.2023**
14		Vorstellung Entwurf Ämterrunde (vor Sommerferienbeginn)			17.07.2023	17.07.2023
15		Entwurfsplanung (Vorabzug)			30.10.2023	30.10.2023
16		Plausibiliträtsprüfung (extern)		1,4 Monate	31.10.2023	08.12.2023
17		Rücklauf Plausibilitätsprüfung			08.12.2023	08.12.2023
18		Vorlaufzeit Magistratssitzung		2,5 Monate	18.12.2023	26.02.2024
19		Ausführungsvorlage (Magistrat)			27.02.2024	27.02.2024
20		Ausführungsvorlage (Stadtverordnetenversammlung)			21.03.2024	21.03.2024
21		**Genehmigungsplanung (LPH 4)**		**3 Monate**	**06.11.2023**	**26.01.2024**
22		Abgabe Genehmigungsplanung (Vorabzug)			26.01.2024	26.01.2024
23		Prüfung Genehmigungsplanung AG		1,8 Wochen	29.01.2024	09.02.2024
24		Abgabe Genehmigungsplanung			12.02.2024	12.02.2024
25		**Ausführungsplanung (LPH 5)**		**5,5 Monate**	**01.04.2024**	**02.09.2024**
26		Ausführungsplanung Vorabzug			08.07.2024	08.07.2024
27		Abgabe Ausführungsplanung			02.09.2024	02.09.2024
28		Prüfung Ausführungsplanung AG		3 Wochen	03.09.2024	24.09.2024
29		Freigabe Ausführungsplanung			25.09.2024	25.09.2024
30		**Vorbereiten der Vergabe (LPH 6)**		**4 Monate**	**13.05.2024**	**02.09.2024**
31		Prüfung LV d. AG		3 Wochen	04.09.2024	25.09.2024
32		Fertigstellung LV	5 Tage	1 Woche	25.09.2024	01.10.2024
33		Veröffentlichung LV			01.10.2024	01.10.2024
34		Vorlauf bei VS	5 Tage	1 Woche	02.10.2024	08.10.2024
35		Angebotsfrist	30 Tage	1,5 Monate	09.10.2024	19.11.2024
36		Submission			19.11.2024	19.11.2024
37		Prüfung und Vergabeempfehlung	10 Tage	2 Wochen	20.11.2024	03.12.2024
38		Vorbereitung Vergabebeschluss d. AG	5 Tage	1 Woche	04.12.2024	10.12.2024
39		Vorlauf Beschlussvorlage	10 Tage	2 Wochen	20.01.2025	31.01.2025
40		Vergabebeschluss			31.01.2025	31.01.2025
41		Vorlauf Bauanlaufberatung	5 Tage	1 Woche	03.02.2025	07.02.2025
42		Inbetriebnahme Parkhaus / Baufreiheit			01.01.2025	01.01.2025
43		Bauphase	6 Monate	6 Monate	24.02.2025	08.08.2025
44		Fachplanung Entwässerung/Sanitär/Hochbau		1,63 Jahre	03.03.2023	02.09.2024
