Datei: Neubau Männerwohnheim _19-08.PPL

Projektnummer: 19-08

Bauzeitenplan

Neubau Männerwohnheim

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**VORENTWURF-/ENTWURFSPLANUNG**			
2	Planung LPH 3	39at	Mi, 01.04.20	Fr, 29.05.20
3	Plausi-Prüfung , planungsbegleitend	17at	Mo, 06.04.20	Do, 30.04.20
4	Erst. AV / Unterschriftengang / KOOP	26at	Di, 14.04.20	Mi, 20.05.20
5	Sitzungslauf / Ausführungsbeschluss	51at	Mo, 20.04.20	Fr, 03.07.20
6	Genehmigungsplanung LPH 4 Neubau	20at	Mo, 06.07.20	Fr, 31.07.20
7	Abbruchantrag	9at	Mo, 27.04.20	Fr, 08.05.20
8	Genehmigungszeitraum	128at	Mo, 03.08.20	Fr, 29.01.21
9	Planung LPH 5	45at	Mo, 31.08.20	Fr, 30.10.20
10	Ausschreibung LPH 6 KG 300-400	25at	Mo, 02.11.20	Fr, 04.12.20
11	Angebotserstellung Firmen	38at	Mo, 16.11.20	Fr, 08.01.21
12	Auswertung Angebote LPH 7	48at	Mo, 07.12.20	Fr, 12.02.21
13	Vergabegespräche LPH 7	58at	Mo, 14.12.20	Fr, 05.03.21
14	Beauftragung , Vorlauf Firmen	63at	Mo, 04.01.21	Mi, 31.03.21
15	**AUSFÜHRUNG - ABBRUCH**			
16	Ausschreibung Abbruch	10at	Mo, 14.09.20	Fr, 25.09.20
17	Bearbeitungszeitraum Abbruchfirmen	20at	Mo, 28.09.20	Fr, 23.10.20
18	Auswertung Angebote Abbruch	15at	Mo, 26.10.20	Fr, 13.11.20
19	Beauftragung Abbruch	10at	Mo, 16.11.20	Fr, 27.11.20
20	Baustelleneinrichtung	2at	Mo, 01.02.21	Di, 02.02.21
21	Abbruchmaßnahme	16at	Mi, 03.02.21	Mi, 24.02.21
22	Freimeldung Grundstück	2at	Do, 25.02.21	Fr, 26.02.21
23	**AUSFÜHRUNG HOCHBAU 2 HÄUSER**			
24	Rohbauarbeiten	75at	Mo, 01.03.21	Fr, 18.06.21
25	Dachdeckerarbeiten	20at	Mo, 21.06.21	Fr, 16.07.21
26	Fensterarbeiten gem. Maßvorgabe	10at	Mo, 05.07.21	Fr, 16.07.21
27	Rohinstallation HLSE	25at	Mo, 05.07.21	Fr, 06.08.21
28	Schreinerarbeiten Fensterbänke	5at	Mo, 19.07.21	Fr, 23.07.21
29	Schlosserarbeiten Geländer	5at	Mo, 26.07.21	Fr, 30.07.21
30	Innenputzarbeiten	30at	Mo, 09.08.21	Fr, 17.09.21
31	Estricharbeiten	10at	Mo, 20.09.21	Fr, 01.10.21
32	Trocknungszeit Estrich	21at	Mo, 04.10.21	Mo, 01.11.21
33	Trockenbauarbeiten Decken	10at	Mo, 18.10.21	Fr, 29.10.21
34	WDVS - / AUSSENPUTZARBEITEN	29at	Di, 02.11.21	Fr, 10.12.21
35	Maler- / Tapezierarbeiten	29at	Di, 02.11.21	Fr, 10.12.21
36	Bodenbelagsarbeiten	20at	Mo, 13.12.21	Fr, 07.01.22

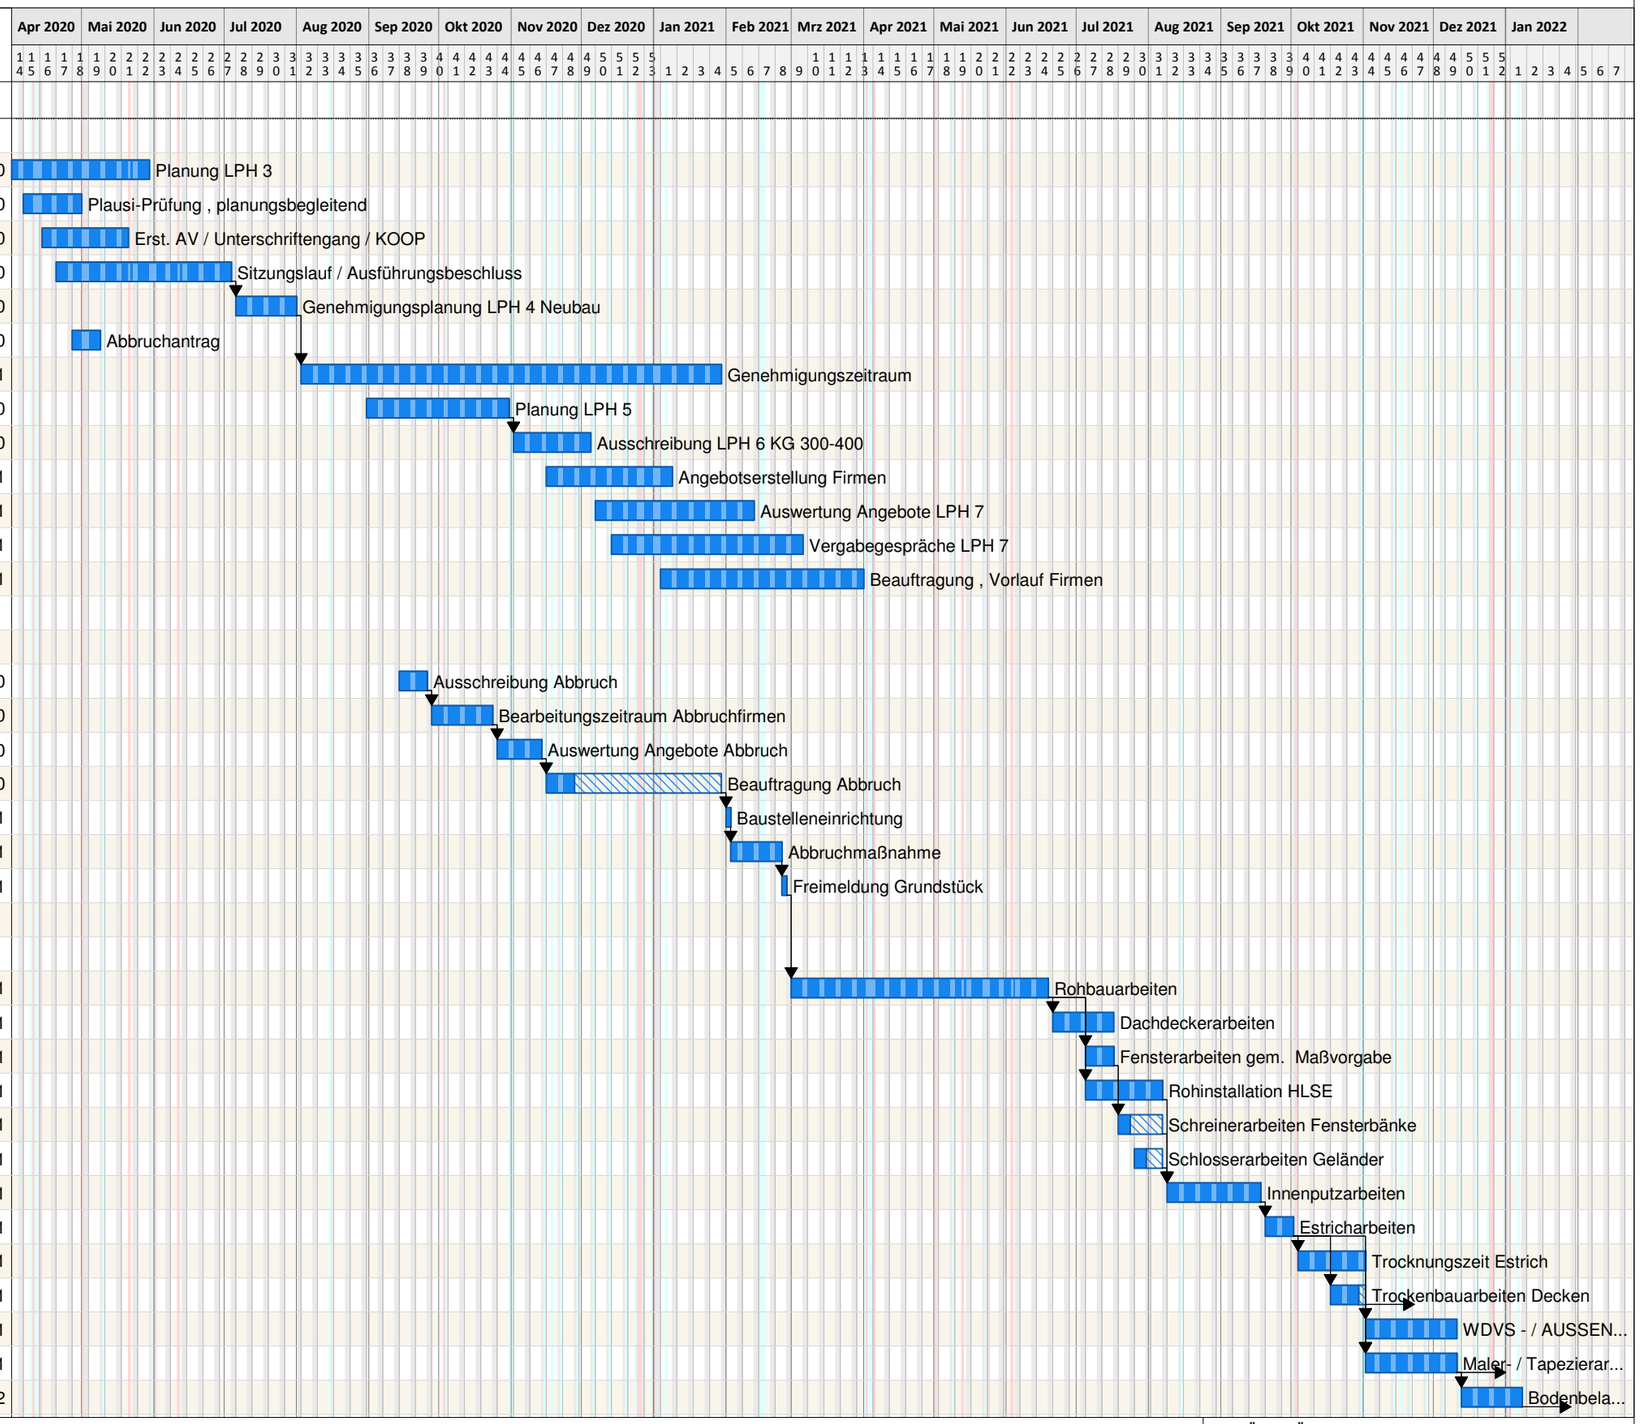

Projektzeitrahmen von Mi, 01.04.20 bis So, 03.04.22
Kalender: Hessen (eingebettet)
Druckdatum: 24.04.2020 13:59
Filter:
Bearbeiter:

SCHÖN+RÜCKOLDT Architekten
Venatorstr. 10
D-65191 Wiesbaden
Tel. +49 611 20480711
Fax +49 611 20480720
e-Mail: m.rueckoldt@architekten-schoen-rueckoldt.de

erstellt mit pro-Plan 6 (6.0.0.48) Serien Nr.: 432 Lizenz für SCHÖN+RÜCKOLDT, Wiesbaden

Projektnummer: 19-08

Bauzeitenplan

Neubau Männerwohnheim

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
37	Fliesenarbeiten	19at	Di, 02.11.21	Fr, 26.11.21
38	Sanitäre Trennwände	5at	Mo, 29.11.21	Fr, 03.12.21
39	Fertiginstallation HLSE	15at	Mo, 06.12.21	Fr, 24.12.21
40	Schreinerarbeiten Türen	10at	Mo, 10.01.22	Fr, 21.01.22
41	Abnahmen , Mängelbeseitigung	5at	Mo, 24.01.22	Fr, 28.01.22
42	Übergabe an Bauherr	2at	Mo, 31.01.22	Di, 01.02.22
43	**AUSFÜHRUNG AUSSENANLAGEN**			
44	Herstellung Aussengelände	34at	Di, 02.11.21	Fr, 17.12.21
45	1	15at	Mo, 31.01.22	Fr, 18.02.22

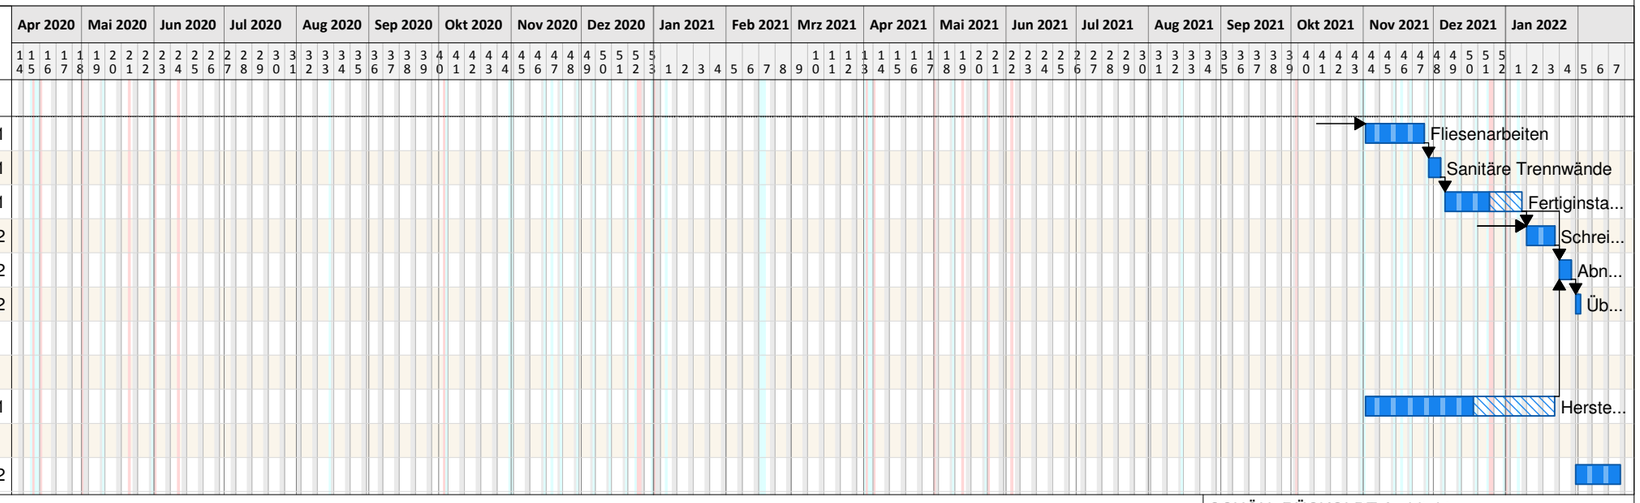

Projektzeitrahmen von Mi, 01.04.20 bis So, 03.04.22
Kalender: Hessen (eingebettet)
Druckdatum: 24.04.2020 13:59
Filter:
Bearbeiter:

SCHÖN+RÜCKOLDT Architekten
Venatorstr. 10
D-65191 Wiesbaden
Tel. +49 611 20480711
Fax +49 611 20480720
e-Mail: m.rueckoldt@architekten-schoen-rueckoldt.de

erstellt mit pro-Plan 6 (6.0.0.48) Seriennr.: 432 Lizenz für SCHÖN+RÜCKOLDT, Wiesbaden
