Planungsterminplan

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Beschlussfassung Ausführungsvorlage**	**1 Tag**	**Don 28.05.26**	**Don 28.05.26**
2	**LP 04 Genehmigungsplanung**	**48 Tage**	**Mit 26.11.25**	**Fre 30.01.26**
3	Freigabe Start Genehmigungsplanung	1 Tag	Mit 26.11.25	Mit 26.11.25
4	Erstellung Basispläne Architekt	10 Tage	Mon 01.12.25	Fre 12.12.25
5	Erstellung Bauantragsunterlagen Architekt	15 Tage	Mon 01.12.25	Fre 19.12.25
6	Erstellung Bauantragsunterlagen HLSK	35 Tage	Mon 08.12.25	Fre 23.01.26
7	Erstellung Bauantragsunterlagen ELT	35 Tage	Mon 08.12.25	Fre 23.01.26
8	Erstellung Bauantragsunterlagen Außenanlagen	35 Tage	Mon 08.12.25	Fre 23.01.26
9	Erstellen Brandschutzkonzept	15 Tage	Mon 05.01.26	Fre 23.01.26
10	Erstellung Wärmeschutznachweis	35 Tage	Mon 08.12.25	Fre 23.01.26
11	Erstellung Bauantragsunterlagen Statik	35 Tage	Mon 08.12.25	Fre 23.01.26
12	Zuarbeit Vermesser	5 Tage	Mon 12.01.26	Fre 16.01.26
13	Zusammenstellen Bauantragsunterlagen Architekt	5 Tage	Mon 26.01.26	Fre 30.01.26
14	**Abgabe Bauantrag**	**0 Tage**	**Fre 30.01.26**	**Fre 30.01.26**
15	Genehmigungsphase (Schätzung)	60 Tage	Mon 02.02.26	Fre 24.04.26
16	**LP 05 Ausführungsplanung**	**80 Tage**	**Fre 29.05.26**	**Don 17.09.26**
17	Ausführungsplanung	80 Tage	Fre 29.05.26	Don 17.09.26
18	**LP 06 + 07 Angebotseinholung und Vergabe**	**90 Tage**	**Fre 10.07.26**	**Don 12.11.26**
19	Angebot und Vergabe	90 Tage	Fre 10.07.26	Don 12.11.26
20	**Bauphase**	**330 Tag**	**Fre 13.11.26**	**Don 17.02.28**
21	Bauphase	330 Tag	Fre 13.11.26	Don 17.02.28

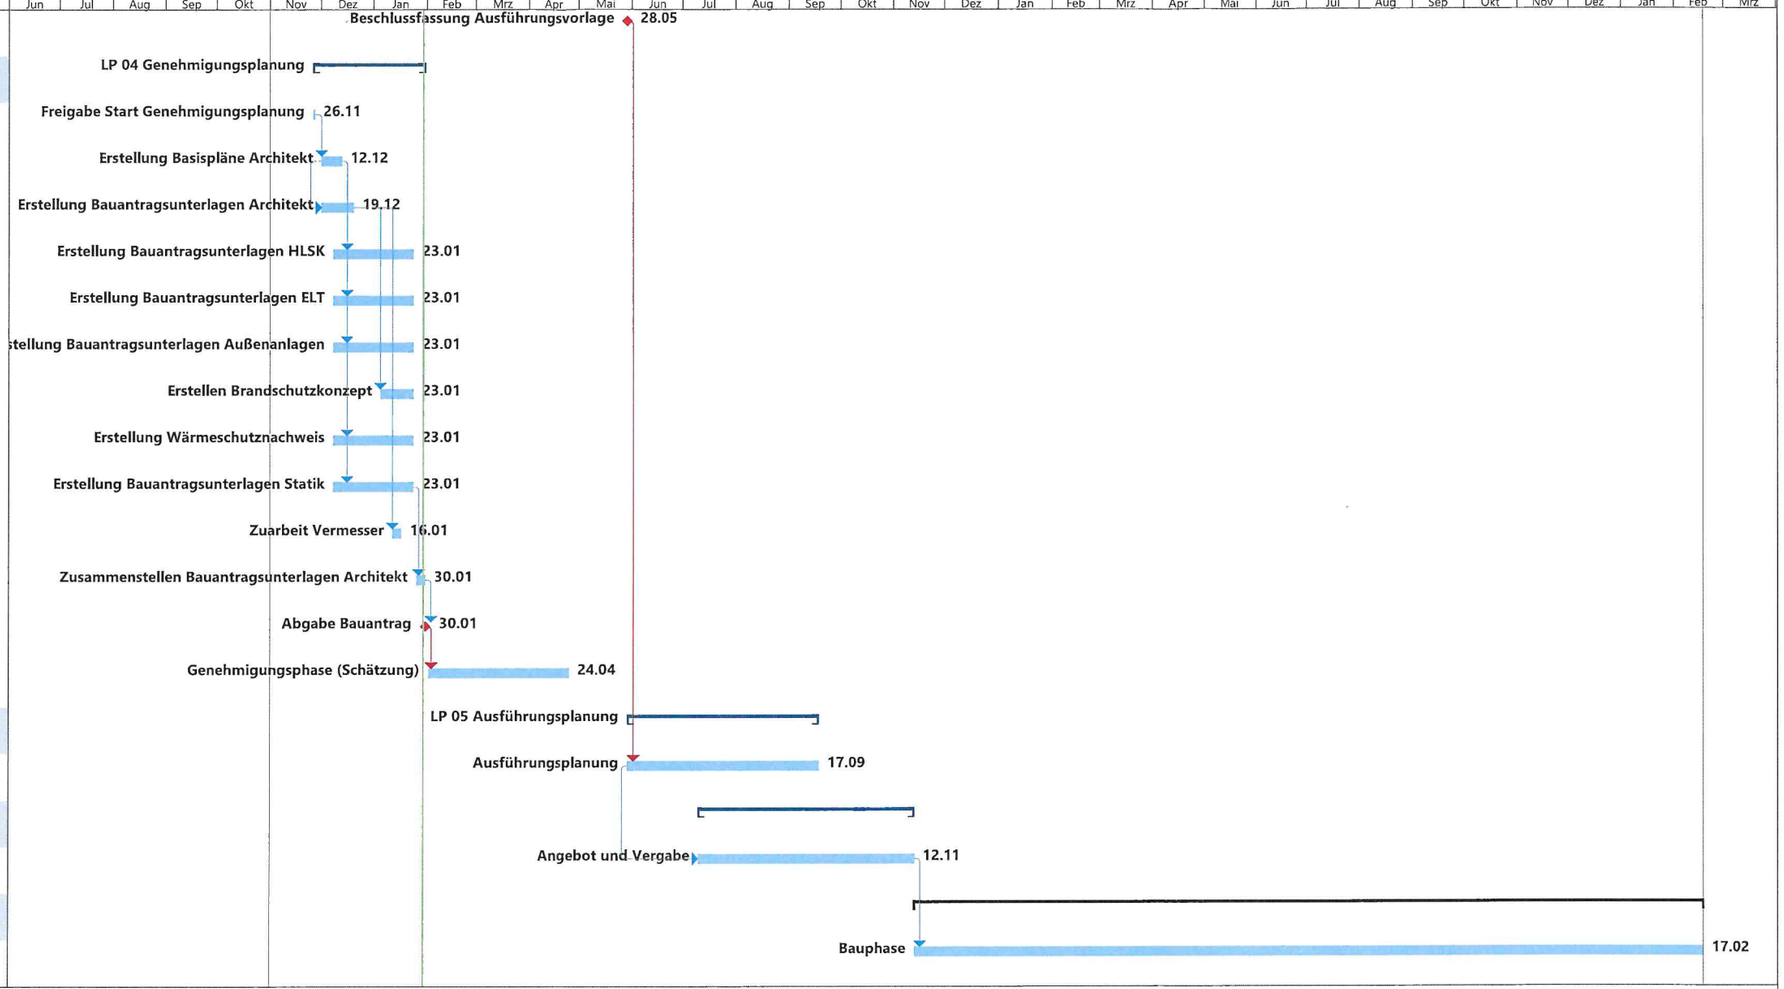

Projekt: Bauhof Delkenheim
Datum: Fre 30.01.26

Task	Summary	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	External Milestone	Manual Progress		
Split	Project Summary	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Deadline			
Milestone	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	External Tasks	Progress			
